


Aktuella vattenvårdsprojekt 2024-2027

*Reparation och underhåll ej inkluderat

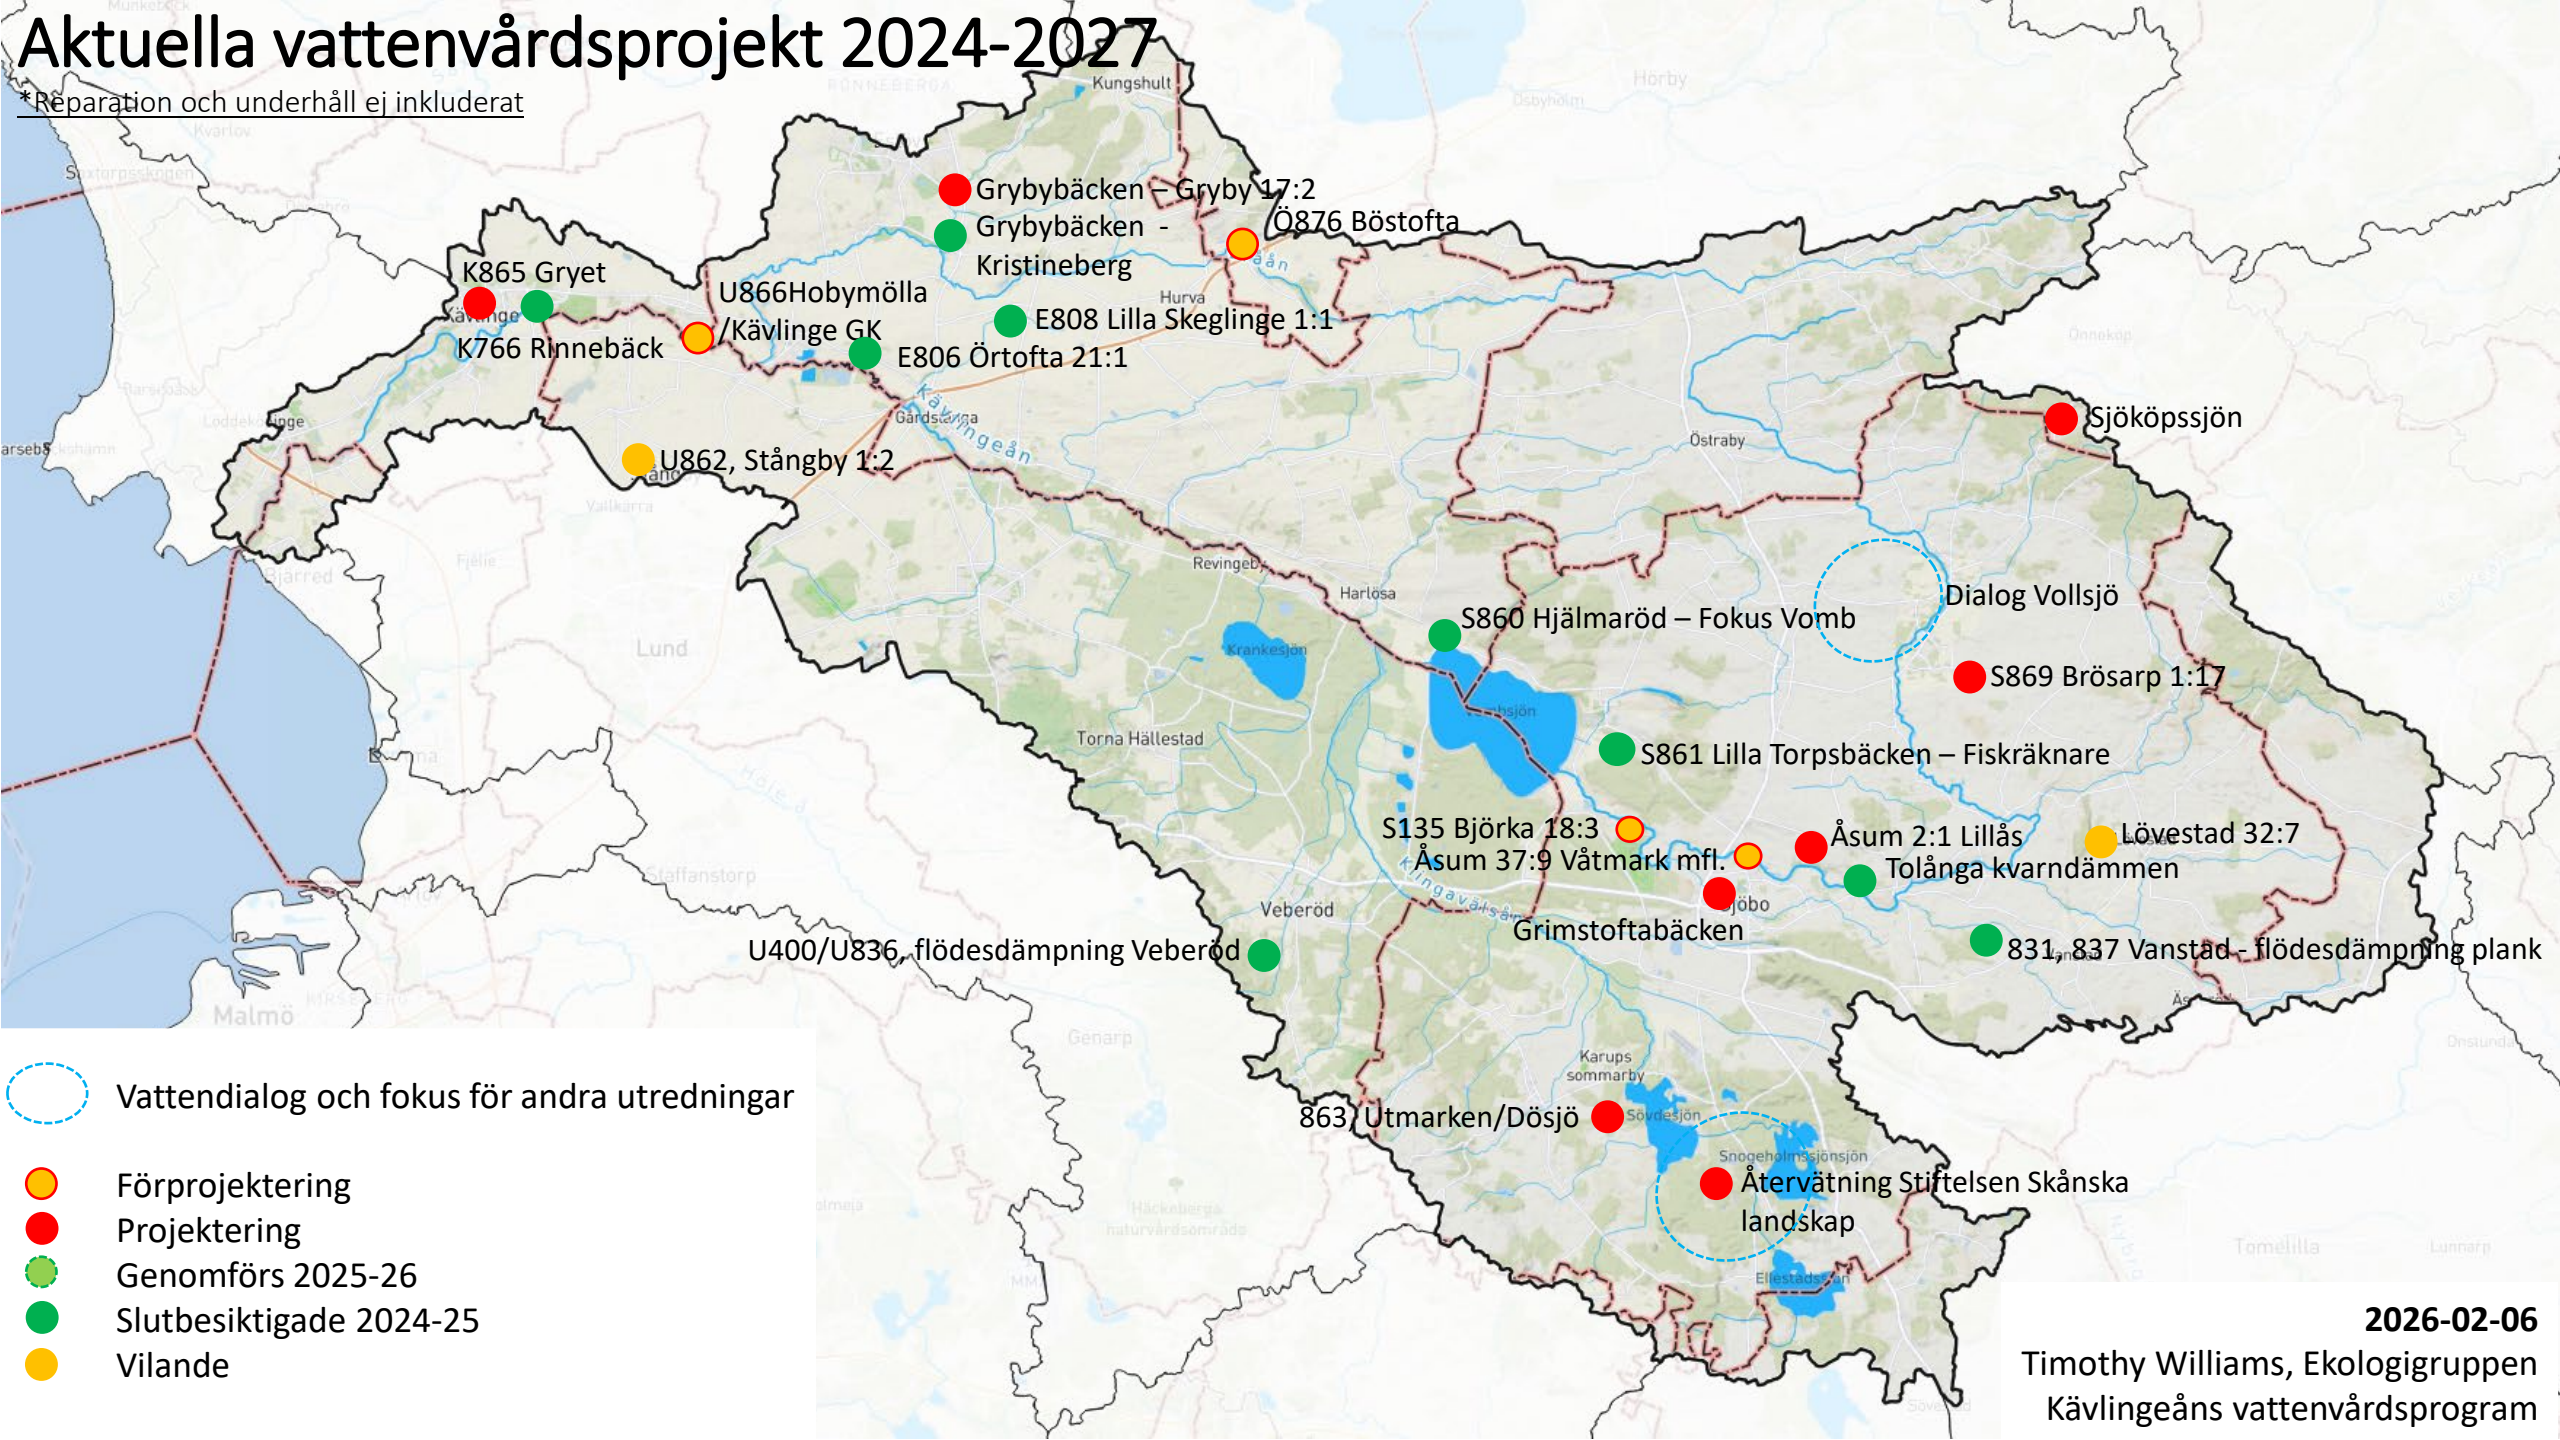

Vattendialog och fokus för andra utredningar

- Förprojektering
- Projektering
- Genomförs 2025-26
- Slutbesiktigade 2024-25
- Vilande

2026-02-06

Timothy Williams, Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag ”Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027”

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvitlock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MÅ = markägare
Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i **rött**.
Prognoseerna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
Uppdaterad 2026-02-06

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Ansvarig EG	Ansvarig kansli	Kommun	Yta	Längd	Skede / avslutat datum	STATUS
Intresseanmälningar								
	Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	FH		-				Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs.
Våtmarker (Näringsrening, Biol. Mångf. m.m)								
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd	AJ		Eslov			Tillägsbeställning	Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekområden för gaddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad. 2025-09: Ett behov av att reparera utloppet från erosionsskador har uppstått. En utredning av omfattningen genomförs samt dialog med entreprenör. 2025-12: Det arbete som krävs för att åtgärda problemen med utloppet till våtmarkerna planeras genomföras höst 2026.
K766	Rinnebäck 1:55	JK		Kävlinge	0,9		Utförd (nov 2025)	2023-11: Möte med Kävlinge kommun om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteraas för kommunen och VR. 2024-11: Underlag till ansökan för vattenverksamhet tas fram. Kommunen har godkänt åtgärden och vill att vi ska gå vidare. 2025-01: Ansökan vattenverksamhet är inskickad. Länsstyrelsen har godkänt finansieringen genom LOVA bidrag. 2025-02: Komplettering inskickad för ansökan om vattenverksamhet, inväntar beslut från Länsstyrelsen. 2025-03: Ansökan om vattenverksamhet är godkänd. Nästa steg är att skriva anbudsunderlag för upphandling av entreprenör. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren. 2026-01: Entreprenad utfördes hösten 2025. Besiktning är gjord. Plantering är gjord. Detaljer kring återställning och plantering kvarstår.
U866	Hobymölla/Kävlinge GK	FH, AJ	TP	Lund	-		Förprojektering	2024-2025: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen, men åtgärderna är för små för att kostnadseffektivitet ska uppnås. Ytterligare projektering fortskrider. Dialog förs med Kävlinge golfklubb om möjlighet att genomföra åtgärd på deras fastighet också för att åtgärden ska vara fortsatt kostnadseffektiv. 2026-01: Förslag på bredare projekt har skickat till kansli/BG för ställningstagande.
K865	Gryet Kävlinge 34:21	JK	TP	Kävlinge	0,5		Förprojektering	2024: Förstudie där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Ett antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen. 2024-11: Kommunen är positiv till åtgärden, kommer ta fram ett förslag för beslut av kommunstyrelsen för fortsatt arbete. 2025-02: En visionsbild är framtagen för att kommunicera potentialen av åtgärden för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver godkänna om åtgärden kan genomföras då den är belägen på kommunens mark samt om kommunen vill bidra för att även skapa rekreativa åtgärder vid platsen. Om åtgärden godkänns av kommunen kommer troligen även en utredning krävas av dikningsföretaget. 2025-03: Dialog förs med kommunen inför beslut av kommunstyrelse om fortsatt arbete. 2025-09: Denna åtgärd har tillfälligt pausats för att återuppta arbetet under 2026. 2025-12: Ett möte ska hållas med Kommunekolog på Kävlinge kommun i början av 2026 angående om, och i så fall när, en åtgärd kan genomföras.
S863	Dösjö - Elsagården 1:1	TD, EB	CB (TP hålls informerad)	Sjöbo	20		Förprojektering	Våtmarker på relativt stort område. 2023-25 Projektering av större våtmarksyta. 2025-09: Under våren beslutades det att åtgärden skulle sättas på paus eftersom MÅ ansåg att de bidrag som var möjliga för honom var för låga. Under sommaren meddelade dock jordbruksverket att ersättningen planeras höjas.2025-11: De nya höjda bidragen har inkluderats i förslaget och det har presenterats för MÅ. MÅ ansåg dock fortfarande att ersättningen var för låg. Eftersom det inte är möjligt att komma upp i en ersättningsnivå som MÅ är tillfredsställd med anser vi att projektet ska pausas/läggas på is tills vidare. 2026-01: Ett nytt försök i dialogen med MÅ har gjorts angående de ekonomiska förutsättningarna kring anläggning av åtgärder. MÅ är nu försiktigt positiv och vi planerar att se om vi kan komma framåt genom vidare dialog. 2026-02: Dialog fortsätter med MÅ.Oolika typer av åtgärder utreds bl.a. pluggning av dränering, fuktångar och grodvatten.
S870	Lövestad 32:7	TA		Sjöbo			Förprojektering	2025-02: Ett möjligt våtmarksläge en förstudie inleds. 2026-01: Beslut om att inte gå vidare har tagits. Detta på grunda av att Lst inte stödjer projektet pga av schaktning i organogen jord. Motiv att gynna lövgröda vägde inte tungt nog i detta fall. Dikningsföretaget tillåter inte dämning.
S868	Åsum-Lillås	TD, JK	TP	Sjöbo	-		Tillståndsansökan	2024-09: Ett första möte med MÅ har genomförts. Interesse finns hos MÅ att skapa bevarningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdåtgärder undersöks. 2024-11: Ett förslag är framtaget och skickat till vattenrådet. Åtgärden är tekniskt möjlig men det är en fråga om finansiering. 2025-01: Det undersöktes om det finns några höga naturvärden kopplat till lång beteshävd på den relevanta ytan, inga höga värden kunde påvisas. 2025-02: Ett samrådsunderlag är framtaget och samråd kommer hållas med Länsstyrelsen under februari månad. Efter samrådet kommer MÅ vara uppdragsgivare och stå för kostnaden. 2026-01: Undersökningssamrådet resulterade i icke betydande miljöpåverkan. En del frågor kring flödesdynamiken behöver utredas innan handlingar kan skickas till domstol.
S874	Åsum 37:9 Våtmark	EB	CB	Sjöbo			Förprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av en våtmark.
S874	Åsum 37:9 Svämplan	SW	CB	Sjöbo			Förprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av ett utökad svämplan vid Björkaån
H765	Sjököppsjön	BW, NS	TP	Hörby	10		Detaljprojektering	2024-11: Återväntning av torv och höjning av sjön. En intresseanmälan har kommit in från en boende i närområdet. Möjligheten för att genomföra en åtgärd undersöks. 2025-02: LONA-medel har tilldelats vattenrådet för att genomföra denna åtgärd. Arbetet fortskrider. 2025-09: Under sommaren gjordes ett fält besök på platsen för att undersöka de hydrologiska förutsättningarna och för att genomföra en biologisk inventering för att se vilka arter som skulle kunna påverkas av en åtgärd. Det observerades relativt höga naturvärden på platsen och arbetet för att anpassa åtgärden för dessa naturvärden fortskrider. 2025-11: Förstudien är genomförd och ett förslag för en åtgärd har tagits fram. 2025-11: Enligt beslut från BG och Kansli så fortsätter arbetet för genomförande av åtgärd. 2026-01: Möte i fält med Lst och MÅ (Sveaskog planeras i januari. 2026-02: Ett möte har skett med Lst där de de generellt ställer sig positiva till åtgärden men hade några frågor som ska besvaras. Ett möte i fält med MÅ och en entreprenör hölls också MÅ ställer sig positiv till åtgärd.

S869	Brösarp 1:17	SW, MJ	TP	Sjöbo			Förprojektering	2024-11: Ett möjligt våtmarksläge, förslag skickat till MÅ. 2025-02: Vattenståndsmätare är utsatt för att ytterligare kunna bedöma förutsättningarna för åtgärd. 2025-09: Bedömning ska göras under hösten för förutsättningarna att anlägga en åtgärd på platsen. 2025-11: Flödesmätningar har inhämtats och visar på att en åtgärd som anläggs med syftet näringsrening inte kommer vara kostnadseffektiv. Möjligheten att anlägga en åtgärd för andra syften, tex biologisk mångfald, utreds vidare. 2026-01: Biologisk mångfald i kombination med näringsrening kan vara skäl att genomföra åtgärden, då djurgård ingår i tillrinningsområdet.
Ö876	Böstofta 19:3	SW	IH	Höör	1,5		Förprojektering	2026-01: Potential finns att anlägga cirka 1,5 h sidovåtmark invid Bråån. Förprojektering påbörjad.

	Vattendragsåtgärder							
	Grybybäcken - Gryby 17:2	HB, MJ,FH	TP	Eslöv			Förprojektering	2025-09: En förstudie är inledd för att undersöka möjlighet till åtgärder längs Grybybäcken på fastigheten Gryby 17:2. 2025-11: En förstudie har genomförts och resultatet har presenterats för Eslövs kommun och MÅ. Förstudien visar att det finns en potential att genomföra åtgärder i vattendraget bl.a. för att gynna fisk. Det togs ett beslut att inte gå vidare med förslagen på rekreativsmiljöer. 2026-01: Arbete med reviderat förslag sker.
E867	Grybybäcken	FH		Eslöv	-		Entreprenad	2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider. 2025-02: Åtgärdsförslag håller på att skapas. Dialog med markägaren förs om hur åtgärden ska genomföras. 2025-03: Projektering är genomförd och MÅ ställer sig positiv till att åtgärden genomförs i år men dialog förs med Lst om möjlighet att få finansiering med fiskevårdsmedel. 2025-04: Fältbesök genomfört med Lst, inväntar beslut om fiskevårdsmedel. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren och startmöte med upphandlad entreprenör hölls i augusti. 2026-01: Entreprenad utfördes under hösten 2025 och är besiktigas och klar. Plantering gjordes i december. Manuellt arbete med återförsel av block är planerat efter sommaren 2026.
S871	Grimstoftabäcken åtgärdspaket	MJ	CB				Detaljprojektering	2025-09: Åtgärdsförslagen som togs fram genom Grimstofta dialogen detaljprojekteras. 2025-12: Arbetet fortskrider med detaljprojektering. Planen är att genomföra åtgärderna höst 2026. 2026-02: Dialog förs med Lst om finansiering inom LOVA och även fiskevårdsmedel ha sökts.
S135	Björka 18.3	TA	TP				Förprojektering	2025-09: En förprojektering för lämpliga åtgärder på vattendragsstäckan genomförs. 2026-01: Arbete med projektering pågår. 2026-02: Ett förslag på utformning av åtgärd har skickats till kansliet.
S875	Åsum 37:9 Vattendrag	AJ		Sjöbo			Förprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för återställandet av en del av en å-fåra i björkaån.

Återvätning

Utredning och Dialog

Ö807	Kontrollprogram Ö807 Rollsberga kvarn	FH	CB				Pågående	Vattennivån och avbördnng mäts vid det anlagda omlöpet. 2026-01: Mätningen är pausad för tillfället eftersom MÅ har ändrat utloppet från det utlopp som anlades av VR. Detta påverkar avbördnngen och resultatet från mätningen. Garantiåtgärder mot erosion genomfördes under hösten 2025.
S861	Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken	TW	TP				Pågående	Uppföljning av de fiskvårdsåtgärder som genomförts i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av en fiskräknare. 2025-02: Fiskräknaren planeras att installeras under feruari. 2025-03: Fiskräknaren är installerad. 2025-09: Fiskräknaren monterades ner i juni och förvaras på Vombverket. Planen är att installera den i omlöpet i december för att fortsätta uppföljningen av omlöpet. 2025-12: installation av Fiskräknaren planeras i början av december. En dialog med forskare på LU har förts om möjligheten av samarbete där LU skulle hjälpa till med genomförandet av uppföljningen. 2026-01: fiskräknaren är installerad, men inte ännu driftsatt pga strömbrist och kyla. 2026-02: Fiskräknaren kunde driftsättas från andra hälften av januari.
U400	Uppföljning Veberöd plankdämme	BW	CB				Pågående	Uppföljning av plankdämmets effekt på höga flöden.
	Återvätning stiftelsen Skånska Landskap	TW	CB				Pågående	Dialog för med MÅ (stiftelsen skånska landskap) och möjliga åtgärder undersöks, fokus för åtgärder kommer vara återvätning och fördröjning. Projektet är finansierat med LONA medel. 2025-04: Ett första dialogmöte har genomförts med stiftelsen. Ett ambitionsmål, metod för genomförande håller på att tas fram. 2025-09: Arbetet med utredningen är påbörjat och kommer fortgå till våren 2026 enligt preliminär plan. Arbetet innefattar en utredning av möjligheterna till total hydrologisk restaurering på fastigheten Ellestad 5:4. Arbetet kommer resultera i en åtgärdsplan för möjliga åtgärder på fastigheten. 2025-11: Under hösten har fälтарbetet för projektet genomförts och är avslutat. En fältdag med Stiftelsen och vattenrådet har också genomförts. 2025-12: En dialog med MÅ och VR har hållts där datan från besiktning presenterades och det fortsatta arbetet diskuterades. 2026-01: Utökad mängd LONA för detta projekt har beviljats av Lst. 2026-02: Arbetet med sammanställning av insamlad data fortsätter.
	Återvätning GIS-studie	MJ	TP				Pågående	En undersökning av potentiella områden för återvätning i Kävlingeåns avrinningsområde. Projektet är finansierat med LONA medel.
	Dialog Vollsjö	TA	TP				Pågående	2025-09: En dialog ska genomföras med ett antal markägare runt Vollsjö. Arbetet kommer startas under hösten 2025. 2025-11: Arbetet fortskrider och ett datum för dialogmötet är satt. 2026-01: Ett första möte hölls i dec 2025. 2026-02: inbjudan till ett andra möte är utskickat, till detta möte är även målgruppen utökad något för att också inkludera ett större område.

Reparation underhåll
Pågående 2025-2026

E806	Örtofta 21:1	TA		Eslöv				2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåmätare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängsla - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ök m FE). 2024-03: Undersökning av läckage utfört i fält. 2024-09: Utredning om läckage fortskrider. 2025-01: Entreprenaden för installation av dräneringsrör i närliggande ålkärr påbörjades i december. Dräneringsröret behövs pga höga vattennivåer som skadar alarna. 2025-03: Entreprenaden är genomförd och avslutad. En nivåmätare är installerad för att följa upp att de önskvärda nivåerna hålls. 2026-01: Nivåmätningar pågår fortfarande, men kan avslutas när MÅ är nöjd. 2026-02: Projektet avslutas
------	--------------	----	--	-------	--	--	--	---

E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH	TP	Eslöv				2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planteringsplan. 2025-03: MÅ har godkänt planteringsplan. Nästa steg är att handla upp entreprenör. 2025-09: entreprenör handlades upp under sommaren o arbetet är planerat att genomföras i höst. 2025-12: Planteringen är genomförd. Insådden kommer göras av MÅ och instruktioner är överlämnade.
S372	Björka översilning - löpande	TA	CB	Sjöbo				Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024-09: årsmöte är genomfört planerad provtagning av dricksvattenbrunnar pågår. 2025-03: Provtagning av dricksvattenbrunnar är genomförd och avslutad.
	Plan för reparation och underhåll 2026	SW						En inventering av behovet av reparation och underhåll av åtgärder, besiktning av åtgärder samt en plan för de rep och underhåll entreprenader som ska genomföras under 2026 tas fram.
E244	Gårdsstånga 17:5	SW	TP	Eslöv				2025-09: Behovet av reparation undersöktes och bedömda finnas. Arbetet bedömdes dock som komplicerat på grund av att de massor som ska hanteras potentiellt kan vara förorenade, därför skjuts reparationen upp till kommande år då möjligheterna för genomförande bedöms som bättre. 2026-02: Reparationens genomförande utreds.
L228	Flyinge 6:9	SW		Lund				2026. Fältbesökt. Fråga om skötselansvar tas upp i BG
K529, K578, K535	Övedkloster 2:23	SW		Sjöbo				2026. Åtgärder vid flera våtmarker/dammar.
H9B	Böstofta 19:3	SW		Höör				2026. Svag igenväxning. Kan samordnas med entreprenad vid ny våtmark på samma fastighet om denna blir av.
E129, 12	Slogstorp 17:8	SW	TP	Eslöv				2026. Rensning inför överlämning - avtal överlämning. Hög prio -överlämning av anläggning enligt överlämningsavtal efter åtgärder.
U186	Igelösa 7:1	SW	TP	Lund				2025. MÅ undrade om möjligheten att få våtmarken vid Örtofta rensad och eventuellt utvidgad. 2025-09: eftersom omfattningen av reparationen bedöms som relativt stor har reparationen av denna åtgärd skjutits till 2026. Kan ev ses som nyanläggning. 2026-02: Möte i fält med MÅ planeras under februari.
L549	Önnerup 33:2	MJ	TP	Lomma				2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationerna av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten. 2025-10: Ett dialogmöte ska hållas med markägare, NSVA m.fl. syfte - synka info om hydrologi. 2026-02: Reparationen är genomförd.
-	Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmällda av markägare)	FH, TW	TP	-				Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.

Utveckling och Övrigt

Framtiden för KVRs arbete, VVP 2.0	TA	CB					Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden. Arbetet har fortsatt i form av ett flertal dialoger med beredningsgrupp och styrelse.
Överlämningsavtal anläggning	TA, FH	TP					Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal. 2026: Slogstorp 17:8 blir den första överlämningen.
Förnyat samarbetsavtal	TA						2025-09: Ett förslag till nytt samarbets avtal för vattenrådet är framtaget.
