


Aktuella vattenvårdsprojekt

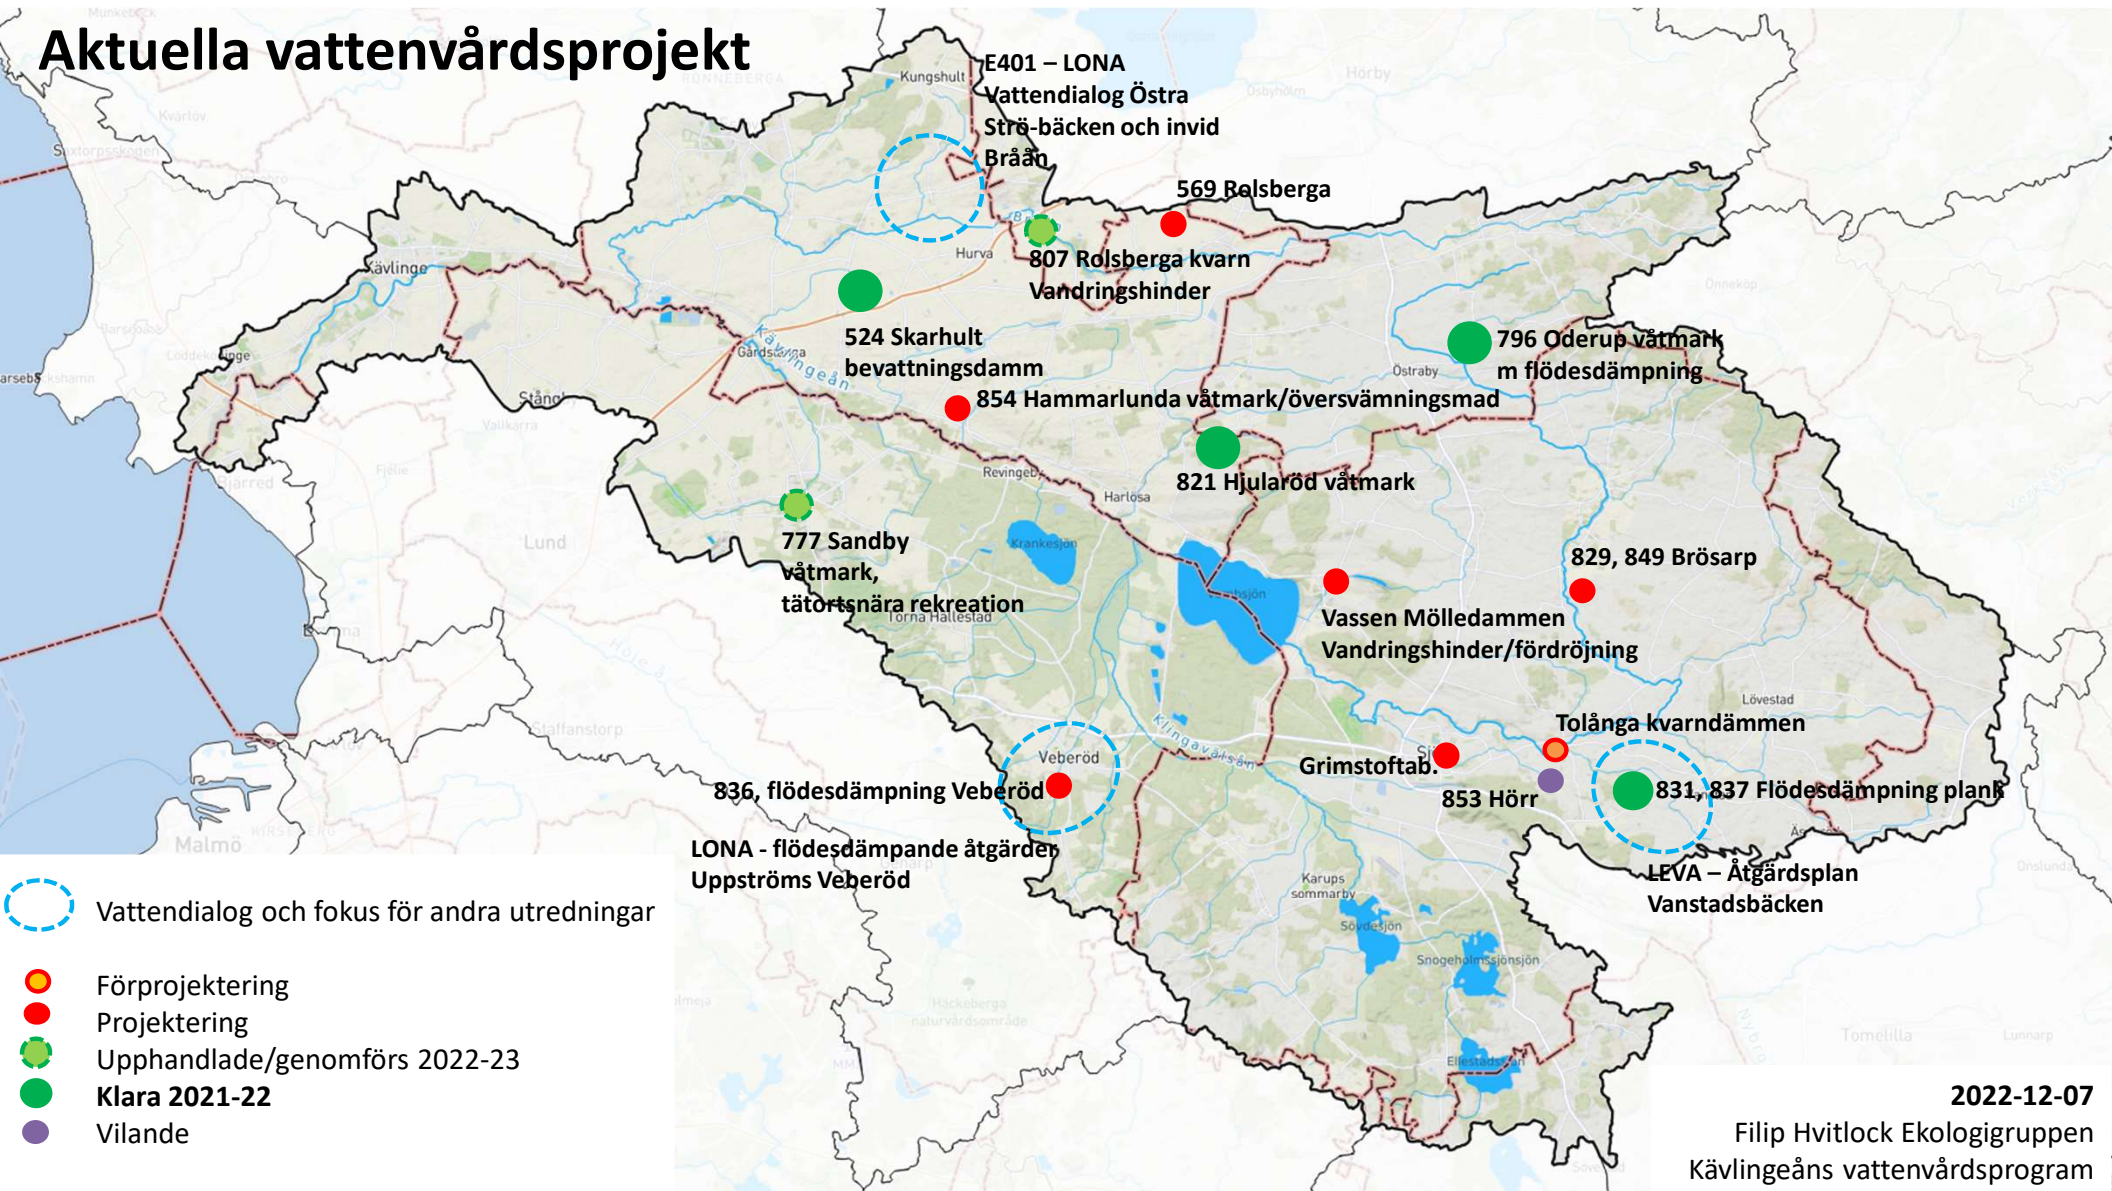

2022-12-07

Filip Hvitlock Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag "Genomförande av del av etapp II,
samt etapp III"

Tillägg 2022-2023, 4750 timmar

Uppdragsansvarig: Filip Hvitlock, Ekologigruppen
Tillförordnad: Ea Baden

Pågående projektering och utredning från 2018-2022

Planerat 2022-						Uppdaterad 2022-11-14	
Nr	Fastighet	Ansvarig arbetare		23	Yta	Längd	STATUS
				timmar	ha	m	
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	270,00	0,3	250	2022-11: Beställning efter upphandling ska göras (kansliet). Entreprenör planeras om möjligt till våren 2023, annars sommar/höst.
U400	Flödesdämpande åtgärder-Vereröd	TA	BW	90,00			2022-11: Prognos på priser har tagits fram baserat på utfallet i Vanstad: 0,9-1,5 Mkr (tidigare uppskattning 1,5-2,5 Mkr)
E401	Vattendialog Östra Strö	EB	RN	100,00			Dialogmöte med fokus Bråån vid Östra strö och markavrinning/erosion i november ställdes in. Ny tid ska bokas.
S794	Vassen, Mölledammen	BW	TA	210,00		110	2022-12: Möte med Lst för 6/12 att diskutera hur man kan gå vidare. Lst ska ta medslut om avvägning hydromorfologi mot kulturvärden vår 2023, därefter tar VR beslut om vi ska gå vidare.

Nya projekt 2022-2023

Intresseanmälningar				STATUS
Inkomna intresseanmälningar och förprojektering				2022-12: 35 lägen bedömda. Några kan tas vidare men har prioriterats och är vilande i väntan på utrymme i budget och resurser. Blentarp 14:2, Sjöbo och Benstorp 2:4, Eslöv har högst potential.
	TA	SW	150	

Nr Detaljprojektering							
S829	829 Brösarp 3:7 m fl	SW	MJ (TA)	150	1,5		Se 849 nedan.
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl	MJ	SW (TA)	250	1		Sammanträde med dikningsföretag i jan 2023, mål om överenskommelse inför omförrättning. Mål: Skicka in anm vattenverksamhet och omprövning snarast därefter. Lagt till 100 h för hantering av DF.
569	569 Hejdeholm - Uppbrytning kulvert	HD	BW (BA?)	150	1		Ca 800 m ny bäck och en-två höljor. Projektering pågår. Beräkning och avstämning kring schaktmassor. Anl 2023.
S839	Grimstoftabäcken - dialog	MJ	HB(fisk)	150	0,5		2022-10-28. Läge 1 Hörr 2:5 pausat. Läge 3 tittas närmare på (MJ). Läge 7 tittas närmare på (HB). Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo. Läge 13 fältbesökt.
	Vandringshinder Björkaån Bråån	FH	HB (MWu?)	150			Dialog med Tolånga försöksnäringsförening och Lst. Två dämmen finns, båda med åtgärdsbehov, det övre är akut då plankstätter inte finns. Tas vidare stegvis: 1. Åtgärda fiskfälla 2. Projektera och för dialog för ev. restaurering av sträckan uppströms övre dämnet, samt ytterligare avsänkning. 3. Projektera och för dialog för restaurering av nedre dämnet. Ev kan även översilningsång återställas.
853	853 Hörr 2:5 - Våtmark	NS	TA	150	0,5		Besked 25/10 - markägaren vill inte gå vidare. Han närmar sig pension och vill att nästa ägare av gården ska få bestämma. Lägg som vilande.
854	854 Hammarlunda - Våtmark/svämplan	TA	TW (RN)	150	0,5		Hammarlunda 8:4 och 1:24, Eslövs kommun. Två olika markägare påbörjat 22-10-07. Projektering och dialog med markägare pågår.
	Ersättare till Hörr 2:5						Ev. tas Benstorp eller Blentarp in här.

Entreprenadkontroll				Yta, ha	Längd, m	
831, 837	Vanstad plankdämmen (831 och 837)	SW	TA (RN)	100		2022-12: Arbetet klart, slutbesiktning 2/12. Priser har inkommit för dämmen - Veberöd kan räknas på.
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	111	5	2000
E524	524 Skarhult	JK	TA	15		
2022-11: Arbetet klart. Slutbesiktning i dec. Sådd av gräs till våren. VA Syds dagvattendamm är fördröjd - detta sköter de själva. Påverkar vattenpåsläppet dock.						
2022-12: Planteringsplan gjord - skickat till tre entreprenörer (direktupphandling), beställning gjord, platering görs snarast.						

Nr	Reperation o underhåll	Ansvarig	Timmar	Yta	Längd	
S157	Vollsjö säteri	TD	BB	60		2022-11: Skärskau har inkommit med uppdaterad offert: 358 443 kr (2021: 267 443 kr) - Vi inväntar beslut från VR om att gå vidare. Vi avvaktar med att åtgärda fiskvägen (anlagd 1999 och bör uppdateras), andra vandringshinder har högre prio.
S372	Björka	TA	HB	90		Sjöbo kommun bekostar löpande skötsel. Avtalsförslag uppdateras i nov. Vattenrådet får besluta vidare om hur underhållskostnaderna, som framgent förväntas bli ca 55 kkr/år i medel ska fördelas. Beslut kommer sedan att biläggas skötselplan.
806	Örtofta 21:1	TA		25		2022-11: Läckage är tätade, man får inte facit förrän vatten släppts på. Plantering och stängsling ska kvarstå.
793	Högseröds kvarn 793	FH	HB	10		2022-12: Lös problem med brötbildning i tömningsutlopp. Rensgaller ok som tilläggsbeställning JKN. 49 kkr.
	Tolånga övre dämme	FH	HB	30		Reparation av planksättar. Mål att utföra detta snarast om flödet tillåter
EJ AVROPADE						
	7 objekt tittas på, fler kommer in successivt.	JK	TA, TD	60		Markägare hör av sig då och då med förfrågningar. Prioritering görs. En samlad insats under 2023 kan vara aktuell.

Utveckling och dialog

Utvecklingsarbete			50		Minskad från 150 till 50.
Information, dialog			40		VR har bett EIG att ta dialog med Revinge by ang översvämn, samt med Kävlingeån FVO ang åtg vid Rinneback.
Underlag, stöd till projektkontor			50		Minskad från 100 till 60, varav 20 h är allokerade till Sövde byalag.
Dialog och uppsökande - Sövde byalag	TA	FH	20		Hittills: Underlag till totalentreprenad.
Vanstadbacken LONA-rapportering	TA		100,00		Tette bokar möte med Gustaf T i november.
Uppsökande arbete Lunds kommun ÖP	RN		10,00		Slutrapport skrivs under 2023. Förhoppningsvis hinns en högflödessituation med under kommande vinter.
					Liten insats med att försöka hitta lämpliga lägen för vattenvård och fördröjning inom Lunds kommun, för att integrera potentiella åtgärder o kommande översiktsplan.

Ändrade siffror för prognos av tidsåtgång (Planerat 2022-23) i rött.
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
