


Aktuella vattenvårdsprojekt

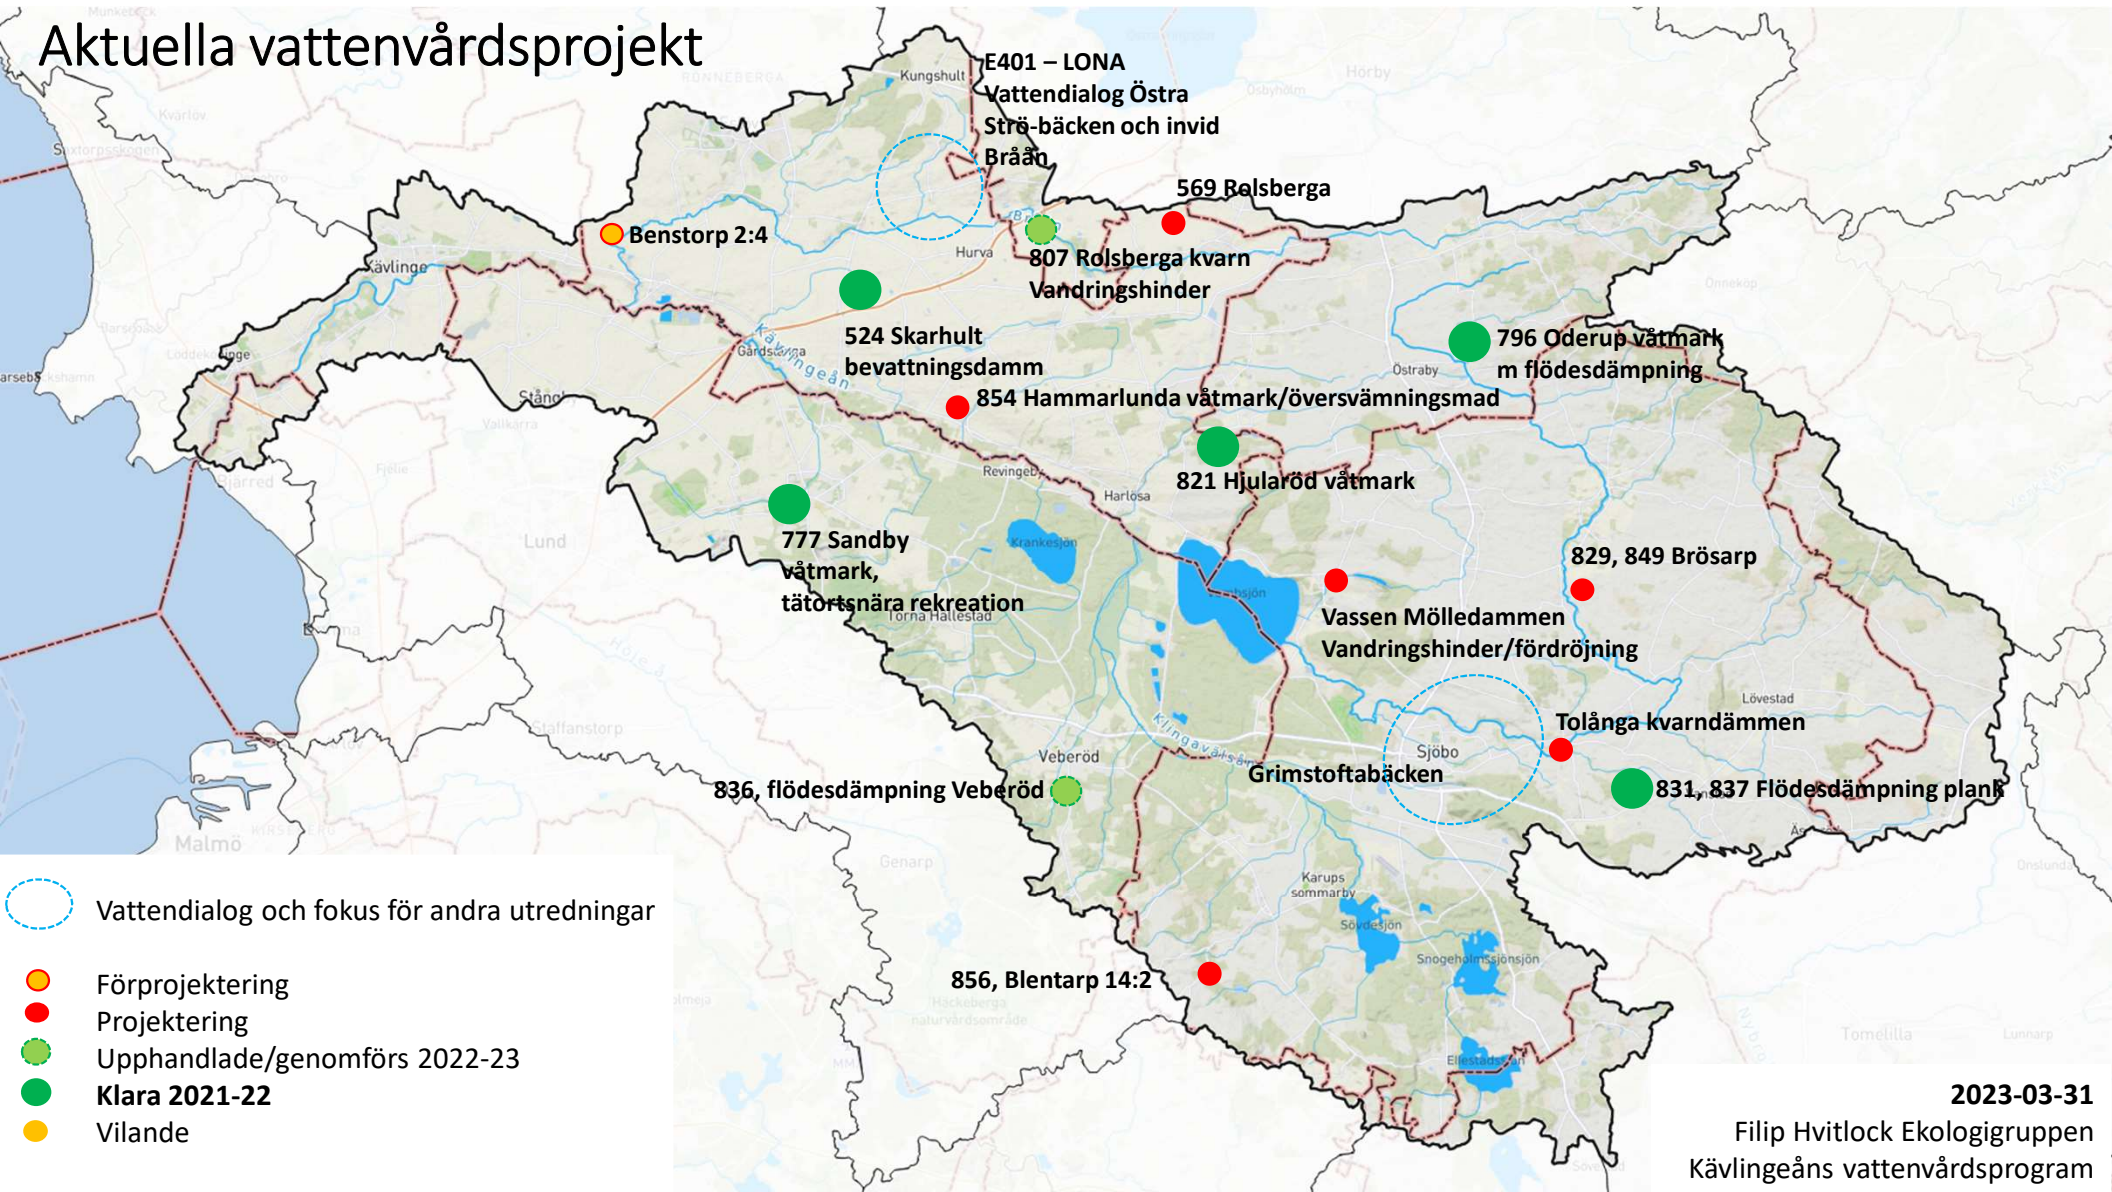

2023-03-31

Filip Hvitlock Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag "Genomförande av del av etapp II, samt etapp III"

Uppdragsansvarig: Filip Hvitlock, Ekologigruppen
Tillfördnad: Ea Baden

Tillägg 2022-2023, 4750 timmar

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen

Pågående projektering och utredning från 2018-2022

Nr	Fastighet	Ansvarig arbetare	Planerat 2022-			STATUS	
			23	Yta	Längd		
			timmar	ha	m		
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	270,00	0,3	250	2023-02-28: Startmöte. Entreprenad påbörjas vid lägre flöden, förhoppning om att vara klara i början av sommaren. ÄTA mätbrunnar ska lämnas av Entreprenör (Nebbhuset).
U400	Flödesdämpande åtgärder-Verberöd	TA	BW	90,00			2023-03: Skärskau AB vann upphandling. Beställning görs. Startmöte kan planeras. 2023-03: Startmöte 13/4. EB2023-03: Dialog KLAR. Vi tar in läge för våtmark som intresseanmälan, men går inte aktivt vidare i närtid med anpassade skydds-zoner, mer än ev dialog med intresserade markägare.
E401	Vattendialog Östra Strö	EB	RN	100,00			EB2023-02: Fokus Bråån, erosionsrisk. Dialog m 8 markägare 2/2. TA och EB, erosion, översvämning och möjlighet till bättre ersättning för anpassade skydds-zoner. Kan vi även få ersättning för åkermark inom svämplan vid ådal? Två markägare var intresserade av anpassad skydds-zon varav en tänker ansöka i år för 3 ha. Ett våtmarksläge blev också aktuellt.
S794	Vassen, Mölledammen	BW	TA	210,00		110	2022-12: Möte hölls med Lst för 6/12 att diskutera hur man kan gå vidare. Lst ska ta med sig om avvägning hydromorfologi mot kuturvården vår 2023, därefter tar VR beslut om vi ska gå vidare. 2023-03: Lst har signalerat att de kommer yrka till vattenmyndigheter om omklassning av Torpsbäcken till lägre krav map hydromorfologi.

Nya projekt 2022-2023

Intresseanmälningar	STATUS
Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	2023-03: Ca 35 lägen bedömda översiktligt. Ca 50 intresseanmälningar inkomna. Intressenter meddelas att ingen plats för nya delprojekt finns för 2023, få för 2024. Nytt prioriteringsarbete görs inför 2024. Nya intresseanmälningar inkommer löpande.
TA SW	150

Nr **Detaljprojektering**

S829	829 Brösarp 3:7 m fl, Sjöbo	SW	MJ (TA)	200	1,5	2023-03: Markägare ska granska ritningar och ta ställning, mindre ändring av schaktlije. En större våtmark och en liten groddamm planeras. Anmälan VV inskickad. Entreprenad samordnas med 849.
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl, Sjöbo	MJ	SW (TA)	250	1	2023-03: Markägaren har godkänt förslag med mindre fosforsdamm istället för större våtmark. Groddamm avstämms med MÅ. Anmälan VV inskickad. Avtal MÅ ska skrivas. Entreprenad samordnas med 829.
Ö569	569 Hejdeholm (Rolsberga 7:7, Höör) - Uppbrytning kulvert	HD	BW (BA?)	150	0,5	2023-03: Ca 700 m ny bäck och en hölja. Beräkning och avstämning kring schaktmassor. Ca 0,5 ha ny Vattenyta kan åstadkommas för ca 850 000 kr i entreprenadkostnad. Anläggning uppskjuten till 2024 pga prioritering mot andra projekt och budget. Projektering och markägarkontakt fortsätter under 2023.
S839	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MJ	FH, HB(fis)	150	0,5	2023-03: MJ tittar närmare på läge 2, 3, 8 och 13. Har utfört ledningskoll och förprojektering pågår för dessa. HB läge 7 och 11. Möjlig anläggning om dessa objekt kan tas vidare. Resten är nedprioriterade. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projektering på ätt objekt för att få in det i FÖP.
S859	Projektering S859 Tolånga övre dämme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån)	FH	HB (MWu?)	180		2023-03: Projektering pågår. Åtgärdsbeskrivning har skickats för granskning till samfällighet och Lst. Fiskevårdsbidrag kan förmodligen fås. Mål 2023: Åtgärda övre dämme - avsakning och rep av luckor, ta bort fiskfälla m.m. Mål långsiktigt: Arbeta med nedre dämme och ev översiling.
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TA	150	0,8-2,3	2023-03: Detaljprojektering. Olika förslag har tagits fram och skickats till MÅ. God potential och kostandseffektivitet. Möjlighet till entreprenad 2024. Sjöbo kommun (Pia Fröjd) har godkänt åtgärdsförslag map grundvattenborra.
E854	854 Hammarlunda 8:4 m.fl., Eslöv - Våtmark/svämplan	TA	TW (RN)	150	0,5	2023-02: Förslag har tagits fram och presenterats för MÅ. Åtgärden krympt betydligt hos den ena MÅ. Lite tveksamt om vi ska gå vidare. Mycket sandigt och inströmningsområde, inte vatten hela året. Stor tillrinning men oklar nytta av åtgärden som näringsfälla och biol. mångfald. Prognos anläggning 2024.

Entreprenadkontroll

Yta, ha Längd, m

831, 837	Vanstad plankdämen (831 och 837)	SW	TA (RN)	145		2023-02: Fortsatt koll på anläggningen behövs. Mindre åtgärder p.g.a. erosion kommer behövas.	
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	180	5	2000	2023-03: Slutbesiktning 13/12 och 19/12 (grön e). Sådd av gräs till våren. VA SYDs dagvattendamm anläggs - entreprenadkontroll för anslutnings dike m.m. i mars-april 2023. Plan slutgiltigt färdigställande maj 2023.
E524	524 Skarhult	JK	TA	15			2023-02: Plantering gjord i dec. VR bekostar 50% av plantering.

Nr	Reperation och underhåll 2023	Ansvarig	Timmar	Yta	Längd	
S157	Vollsjö säteri	TD	BB	60		2023-03: Samordnas med Västerstad och Vallarum. Åtgärdas 2023. 2022-08: Ekologigruppen har gjort PM med bedömning, om massorna återanvänds direkt klassas de inte som avfall, hänv NVV 2009:5. 2022-09: Sjöbo kommun har godkänt rensningsförslaget med uppläggning av massor invid dammen. 2022-11: Skärskau har inkommit med uppdaterad offert : 358 443 kr (direktupphandling, enda anbud 2021: 267 443 kr) - Klartecken från KA 2023-03.
S51	Vallarum 13:4, Sjöbo	TD		20		2023-03: Samordnas med Vollsjö och Västerstad - samma process kring massor, åtgärdas 2023. Skärskau har lämnat pris om 67 325 kr (2021). Kan åtgärdas 2023. Ev problem med massor på betesmark.
H176	Västerstad 23:6, 23:7	TD		20		2023-03: Kan åtgärdas 2023. Även rensning av inlopp behövs. Relativt enkla åtgärder. Direktupphandla entreprenad separat. 2022-10. Behov att reparera utloppsbrunnen. Den har upprostade fästen för brädsättar (U-järn) och brädsättarna är murkna. Insats 2021 med dränering.
E793	Högseröds kvarn - Högseröd 13:1	FH	HB	30		2023-01: Rensgaller till tömningsutlopp lagd som som tilläggsbeställning JKN. 49 kkr. JKN inväntar lägre flöden för att kunna göra jobbet.
E806	Örtofta 21:1	TA		40		2023-03: Garantibesiktning och besiktning av åtgärdad läckande rör gjordes den 2022-12-09. MÅ vill stängla - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ökm FE).
E707	Källstorpsgården 1:21 (Skarhult)	JK		30		Grund bevattningsdamm läcker. Utlopp eller vall mot dike. MÅ (Skarhult) har dessutom idé om att fördjupa.
E708	Skarhult 13:10	JK		30		Carl Johan von Schwerin - Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bekostar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen.
E25	Skarhult 13:36	JK		30		2023-02-09: Dämnet läcker och skulle behöva åtgärdas. Kan åtgärdas i samband med 707 och 708.
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH		10		2023-03: Förfrågan om plantering från MÅ. Förslag om att EG gör planteringsplan och VR bekostar 50%? Finns stöd i förhandsavtal om att VR bekostar plantering om miljönytta finns.
S529	ÖVEDSKLOSTER 2:23 (Ekeback)	HB		50		Diken behöver rensas, planksättar trasiga/ruttna. Inloppsledning behöver spolas. Anlagd 2010. Skulle kunna samordnas med åtgärder mot vandringshinder (VokusVomb)
S372	Björka översilning - löpande	TA	HB	120		2022-12: Förvalningsplan godkänd. Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. EG redovisar vid skötselrådets årsmöte
Sammantaget för reparation och underhåll						
	Ytterligare 3 objekt finns på listan, fler kommer in successivt.	TA, TD	TA, TD	350		Flera åtgärder kan göras 2023 utifrån vad budget tillåter. 2023, uppskattningsvis för drygt 350 h respektive 800 000 - 1 100 000 kr i entreprenadkostnader. Det som inte ryms inom budget 2023 kan skjutas upp till 2024.

Utveckling och dialog

Uppsökande arbete Lunds kommun ÖP	RN		10			Liten insats med att försöka hitta lämpliga lägen för vattenvård och fördröjning inom Lunds kommun, för att integrera potentiella åtgärder o kommande översiktsplan.
-----------------------------------	----	--	----	--	--	--

Ändrade siffror för prognos av tidsåtgång (Planerat 2022-23) i rött.
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
