


# Aktuella vattenvårdsprojekt

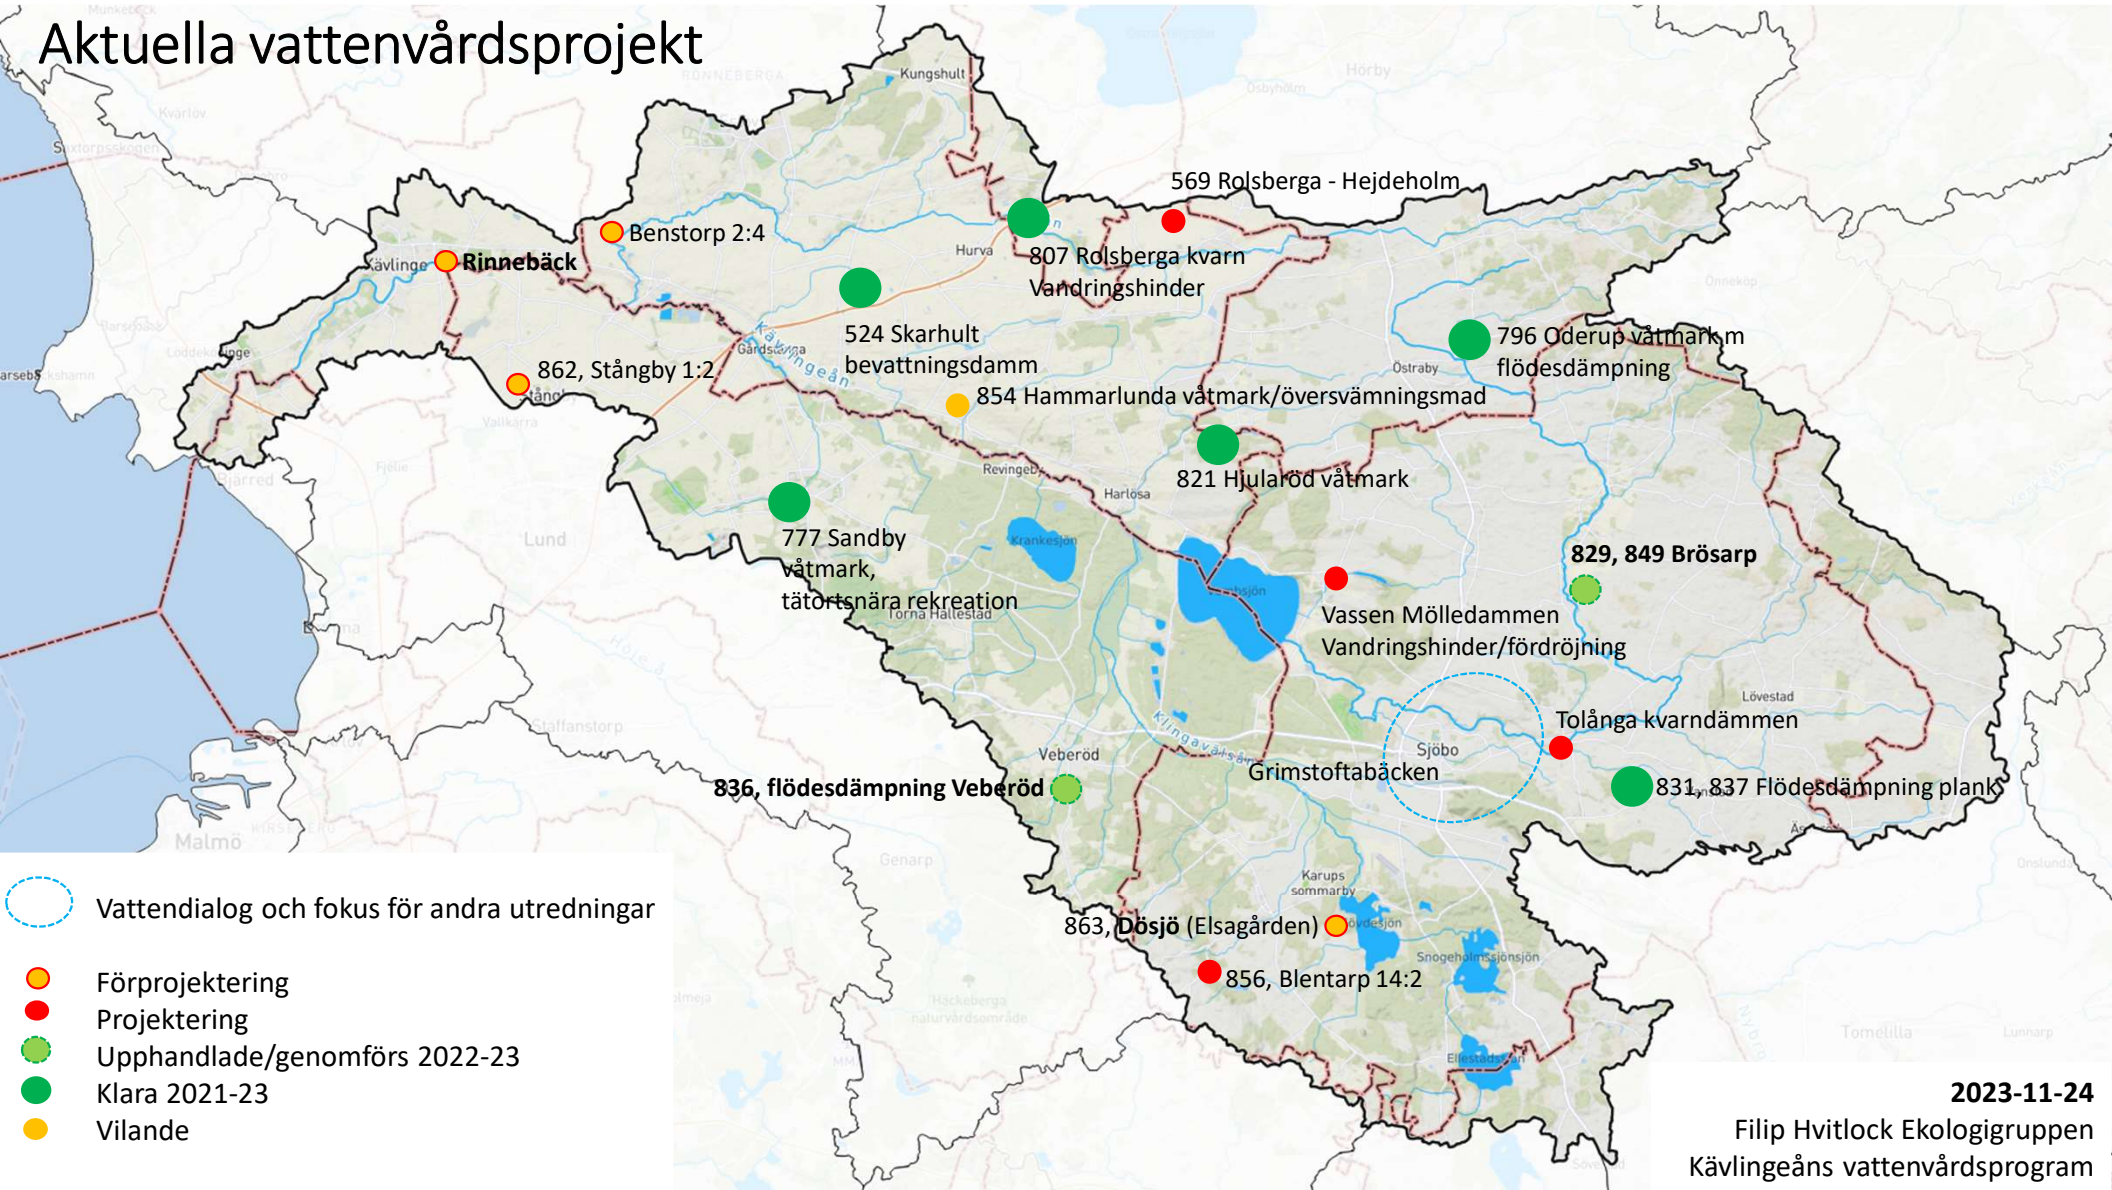

2023-11-24

Filip Hvitlock Ekologigruppen  
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

## KVVP, Uppdrag "Genomförande av del av etapp II, samt etapp III"

Uppdragsansvarig: Filip Hvitlock, Ekologigruppen  
Tillförordnad: Ea Baden

År 2022-2023, 4750 timmar

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MÅ = markägare

### Pågående projektering och utredning från 2018-2022

						Uppdaterad 2023-11-24
Nr	Fastighet	Ansvarig	Kvalitets- kontroll	Prognos		STATUS
				timmar sep- dec 2023	Yta Längd	
S794	Vassen, Mölledammen	BW	TA	50,00	110	2023-06: Beslut om lägre krav på konnektivitet för Möllerdammen och Vassen. Inga krav på fria vandringsvägar, detta ökar sannolikheten att kunna ta ut större volymer vatten till bevattning från Vassen. 2023-10: Två spår kan arbetas med från vattenrådets sida: fördröjning och interbelastning. Möte hölls med Övedskloster den 27/10. Övedskloster vågar inte låsa in Vassen i en fördröjningsåtgärd då detta kan minska möjlig bevattningsvolym, de kommer att gå vidare med detta utan vattenrådets hjälp. Vattenrådet får som bekant inte medfinansiera lantbruksverksamhet, vilket bevattning är. Möjligheter för vattenrådet att arbeta med internbelastning av fosfor i Vassen kvarstår, men läggs på is tillsvidare.

### Nya projekt 2022-2023

Nr	Intresseanmälningar			STATUS	
	Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	TA	SW	40	2023-11: Nytt prioriteringsarbete görs inför 2024-25. S863 Dösjö, U862 Stångby och K766 Rinneback har tillkommit för förprojektering sedan sommaren 2023. Fler möjliga delprojekt tittas på.

#### Förprojektering 10-20 h/proj

U862	Benstorp 2:4	TA	TW	10	0,5	Svämvåtmark och förbättring av tidigare åtgärd. Förprojektering. Kan ev. tas vidare.
	Stångby 1:2 m.fl.	EB	TD	20	1,5	Våtmark. 2023-11: Ny intresseanm. vår 2023. Del av DF behöver tas bort. Förprojekteras och bedöms utifrån effektivitet/görbarhet.
S863	Dösjö - Elsagården 1:1	TD, EB	EB	50	20	Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälan sommar 2023. 2023-11: Goda förutsättningar för stora vattenytor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenytor över 5 ha.
K766	Rinneback 1:55	FH		20	0,5	2023-11: Möte med Kävlings kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark för näringsrening och gäddreproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske.

#### Detaljprojektering

Ö569	569 Hejdeholm (Rolsberga 7:7, Höör) - Uppbrytning kulvert	BW	EB	50	0,5	2023-11: 670 m ny bäck + hölja grovprojekterad. Anläggning ev 2024. Utkast till avtal skickade till MÅ för ställningstagande. Förslag på markersättning ska ses över. Samråd med markägare sker
S839	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MJ	HB	30	0,5	Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projektering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP.
S859	Projektering S859 Tolånga övre dämme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån)	FH	HB (MWu?)	20		Höga anbud i upphandling. Förhandling med entreprenör och markägare pågår. Entreprenad skjuts upp till 2024 pga ekonomi och kort tidsfönster för entreprenad (kräver låga flöden). 2023-11: Dialog med markägare pågår. Mål 2024: Åtgärda övre dämme - avsänkning och rep av luckor, ta bort fiskfalla m.m. Mål långsiktigt: Arbeta med nedre dämme och ev översiling.
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TA	30	0,8-2,3	2023-11: Vattenverksamhet godkänd av Lst. Utformning av avtal är överenskommet med markägare, ska skrivas på. Dialog om stängling pågår. Upphandlingsunderlag ska påbörjas efter att avtalet är påskrivet.

### Entreprenadkontroll

Nr	Fastighet	Ansvarig	Kvalitets- kontroll	Prognoa			STATUS
				timmar sep- dec 2023	Yta	Längd	
S831, S837	Vanstad plankdämen (831 och 837)	SW	TA (RN)	20			2023-09: Fortsatt koll på anläggningen behövs. Mindre åtgärder p.g.a. erosion kommer behövas. Möte med JKN inbokad. 2023-10: Möte i fält 31/10 med entreprenör för att bestämma vad som ska göras. 2023-11: Extra plank ska vibreras ner i marken, på vissa delar ska duk läggas på uppströmssidan.
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	30	5	2000	2023-09: Sådd av gräs och örter, samt pluggplantor, utförd. Inventering i augusti. Utredning av problem med dräneringar. 2023-10: Skötselplan görs /TA. 2023-11: Koll av dräneringar/flödesfördelning framgent.
S829	829 Brösarp 3:7 m.fl, Sjöbo	SW	MJ (TA)	30	1,5		2023-11: Entreprenad pågår - samordnas med 849. Startmöte 25/8. Klara V50 preliminärt. Delbesiktning 12/12. Slutbesiktning senare pga höga grundvattennivåer, vissa arbeten måste göras vid lägre vattennivåer.
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl, Sjöbo	MJ	SW (TA)	30	1		Entreprenad pågår - samordnas med 829 - se ovan.
U400	Flödesdämpande åtgärder-veberöd	TA	BW	90,00			2023-09: Entreprenad påbörjad. Test av olika lösningar på plankkonstruktioner under sommaren. Lösning med stående plank framtagna av E, tillägg på ca 400 kkr. 2023-11: Entreprenad färdigställd, men höglöde 17/11 skadade planken. Slutbeskuts upp tills E har åtgärdat skador och fel.
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	20,00	0,3	250	2023-10: Entreprenad slutbesiktigad. 2023-11. Sättning av peglar kvarstår, efterjusteringar kommer behöva göras (åvilär E). Fältbesök planeras för kontroll av vattennivåer (kontrollprogram).

### Reparation underhåll

#### Planerat 2023

S51	Vallarum 13:4, Sjöbo	TD		20			2023-11: Samordnas med Västerstad - Ev problem med massor på betesmark. Skärskau upphandlad för rensning sedan 2021 - utloppsreparation tillkommer förmodligen (nytt 2023-09). Tilläggsbeställning ska göras.
H176	Västerstad 23:6, 23:7, Hörby	TD		20			2023-11: Samordnas med Vallarum. Rep av utloppsbrunn och rensning av inlopp behövs. Relativt enkla åtgärder. Skärsku upphandlad sedan 2021 (dränering). Tilläggsbeställning gjord.

#### Pågående 2023

E806	Örtofta 21:1	TA		10			2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåmätare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängsla - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ök m FE).
E793	Högseröds kvarn - Högseröd 13:1	FH	HB	10			2023-10: Rensgaller till tömningsutlopp - tilläggsbeställning JKN. 49 kkr. Arbetet är klart.
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH		10			2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning.
S529	ÖVEDSKLOSTER 2:23 (Ekeback)	HB		0			Anlagd 2010. Samordnas med FokusVomb och tas i Lilla Torpsbäcken-entreprenaden.
S372	Björka översilning - löpande	TA	HB	20			Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU.

#### Planerat 2024 och framåt

S157	Vollsjö säteri	TD	BB	60			Nytt pris 2023-04: 366 443 kr + 122 000 kr i ÅTA för transport av massor till upplag. 2023-10: VR söker externa medel för detta inför 2024.
E707	Källstorpsgården 1:21 (Skarhult)	JK		30			2023-08: Grund bevattningsdamm läcker. Utlopp eller vall mot dike. MÅ (Skarhult) har dessutom idé om att fördjupa, vilket VR inte kan bekosta. Samordnas med 708 och 25. Åtgärds 2024.
E708	Skarhult 13:10	JK		30			Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bekostar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25.
E25	Skarhult 13:36	JK		30			Dämnet läcker och skulle behöva åtgärdas. Samordnas med med 707 och 708.
Ytterligare 4 st i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare)							Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.
Summering rep underhåll 2023				240			

### Utveckling och dialog

	Uppsökande arbete Lunds kommun ÖP	RN		3			Liten insats (10 h) med att försöka hitta lämpliga lägen för vattenvård och fördröjning inom Lunds kommun, för att integrera potentiella åtgärder o kommande översiktsplan.
--	-----------------------------------	----	--	---	--	--	---

Summering totalt

783,00

Ändrade siffror för prognos av tidsåtgång (Planerat sept-dec 2023) i rött.  
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
