







Aktuella vattenvårdsprojekt årsredovisning 2023-2024

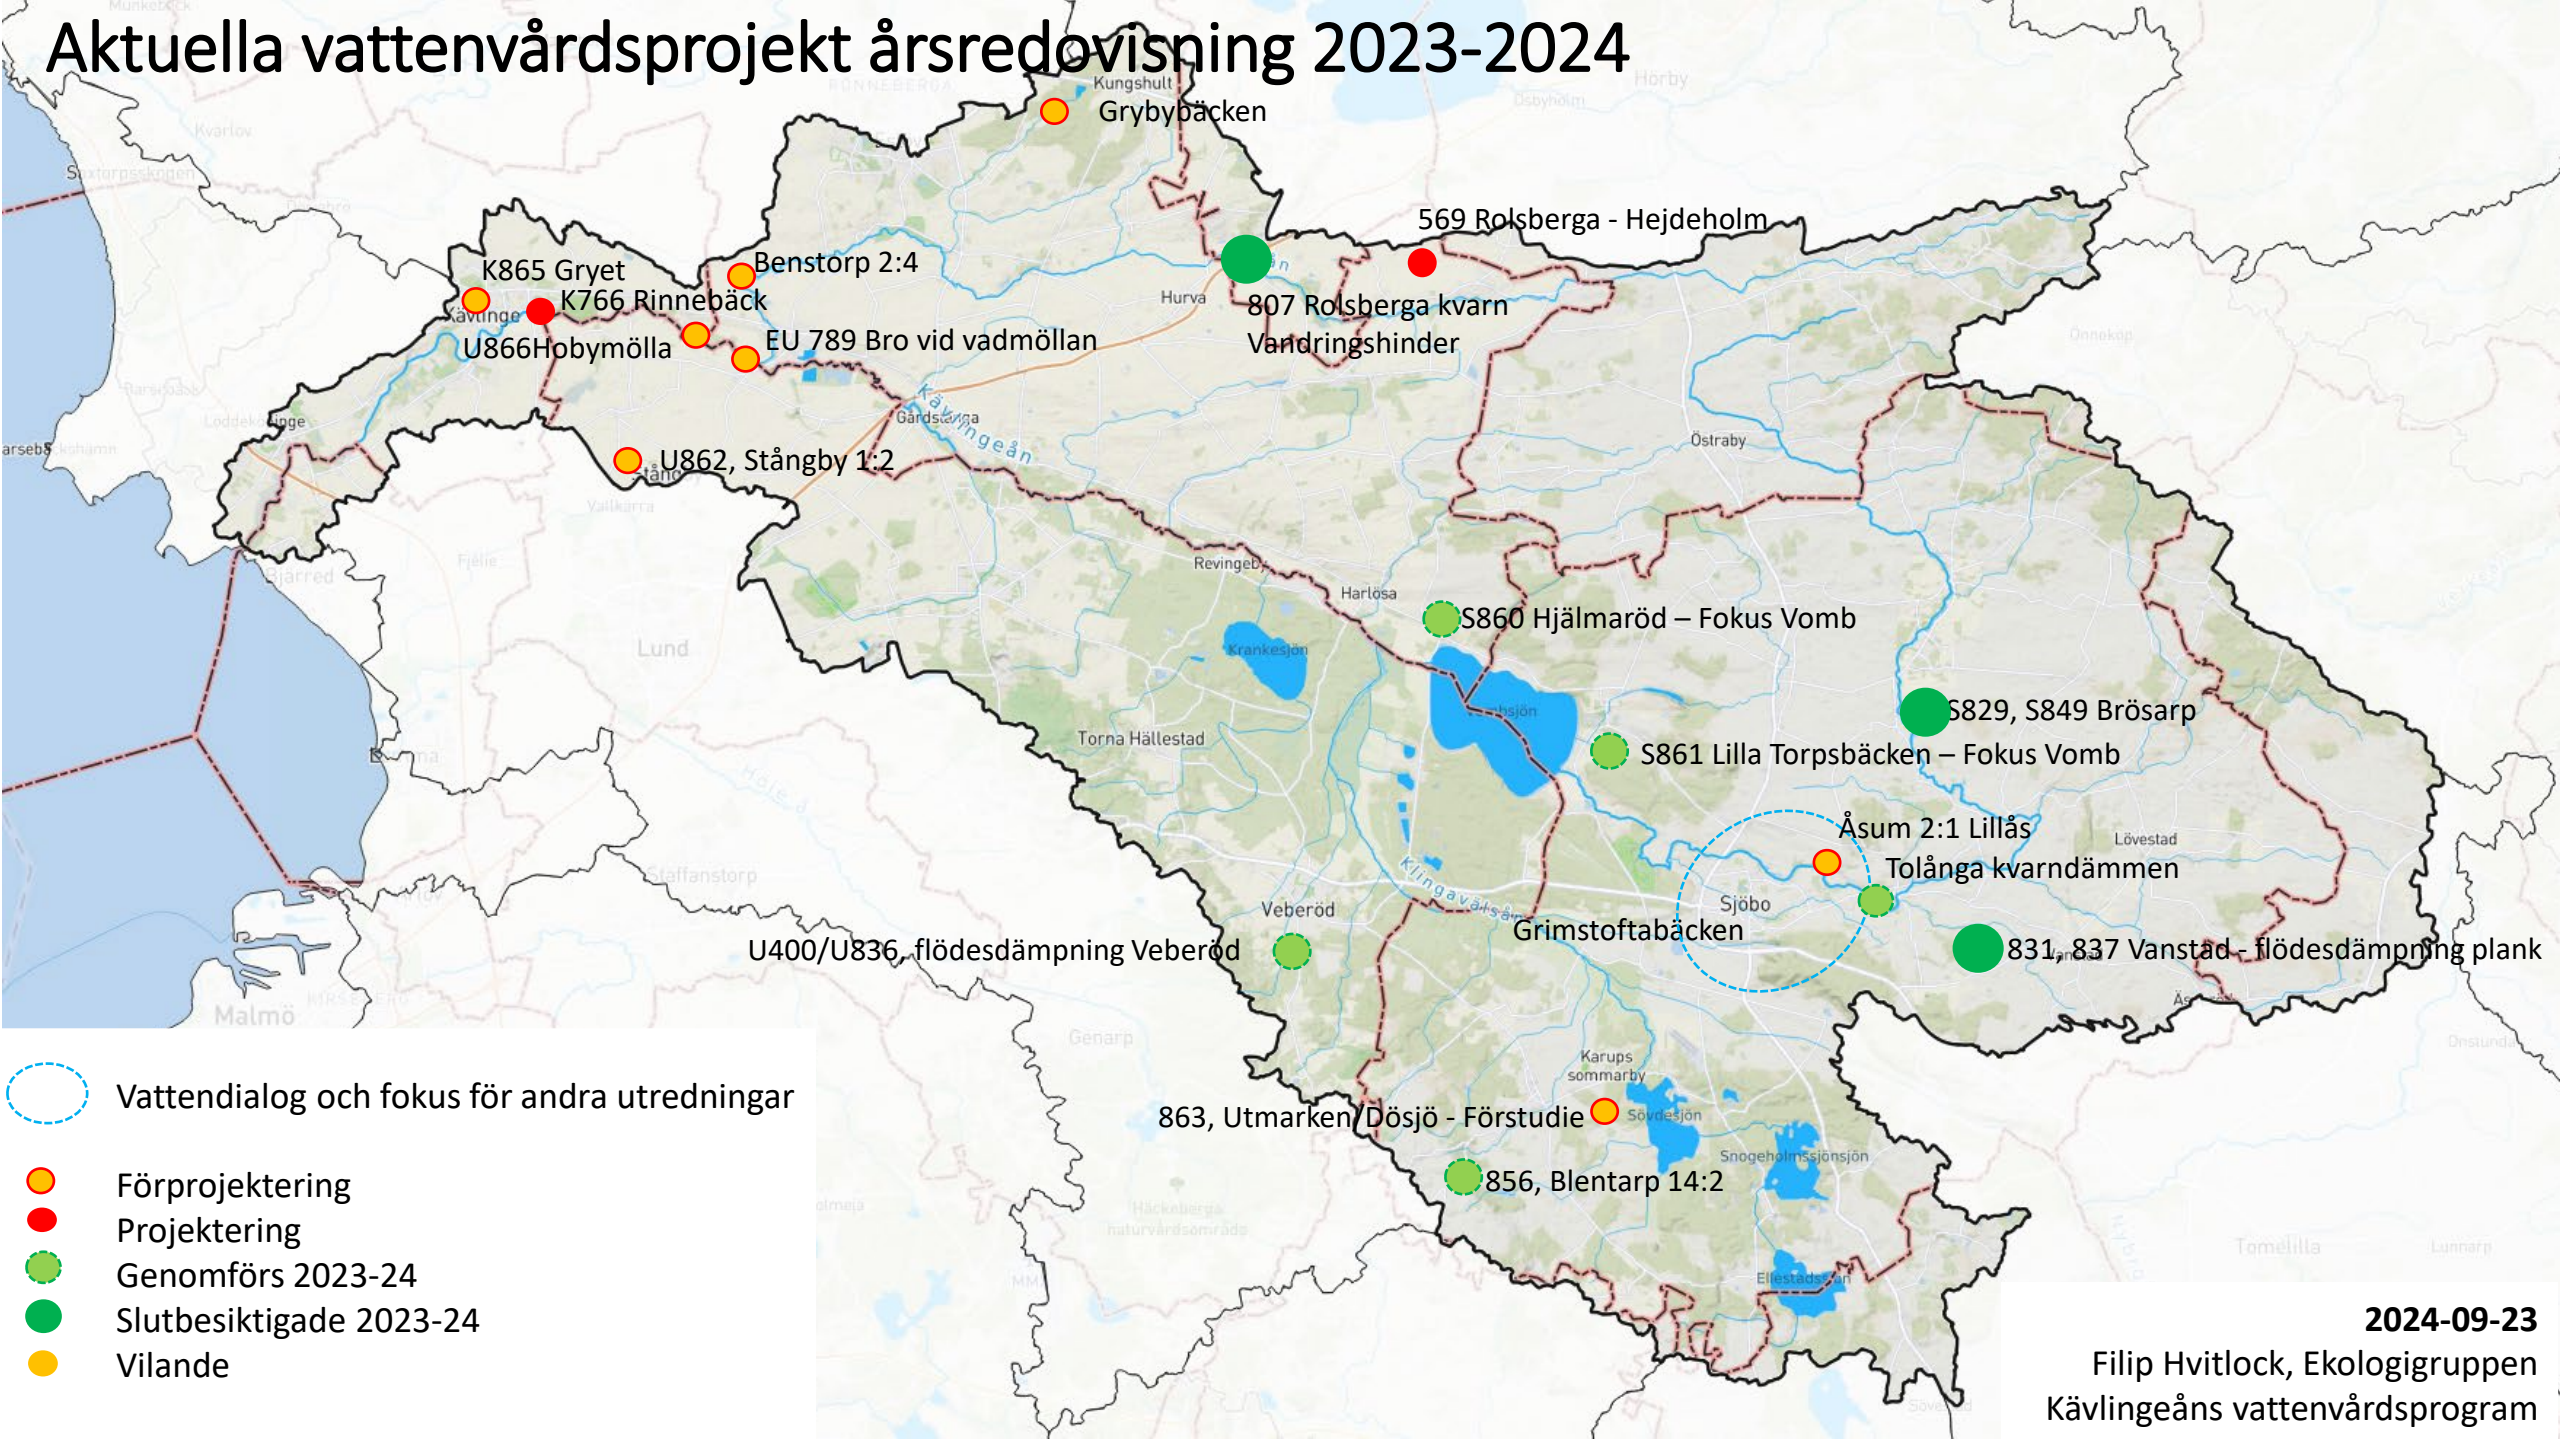

K865 Gryet
K766 Rinnebäck
U866 Hobymölla
U862, Stångby 1:2
EU 789 Bro vid vadmöllan
Grybyåcken
569 Rolsberga - Hejdeholm
807 Rolsberga kvarn
Vandringshinder
S860 Hjälmared – Fokus Vomb
S829, S849 Brösarp
S861 Lilla Torpsbäcken – Fokus Vomb
Åsum 2:1 Lillås
Tolånga kvarndammen
831, 837 Vanstad - flödesdämpning plank
U400/U836, flödesdämpning Veberöd
863, Utmarken/Dösjö - Förstudie
856, Blentarp 14:2

 Vattendialog och fokus för andra utredningar

-  Förprojektering
-  Projektering
-  Genomförs 2023-24
-  Slutbesiktigade 2023-24
-  Vilande

KVVP, Uppdrag "Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027"

Uppdragsnavig och projektledare: Filu Hvilstock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MA = markägare

Uppdaterad 2024-08-21

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Kvalitets-				Längd	STATUS
		Ansvarig	kontroll	Kommun	Yta		
Intresseanmälningar							
Inkomna intresseanmälningar och förprojekttering							
		FH	TA	-			Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs.
Förprojekttering 10-20 h/proj							
	Benstorp 2:4	TA	TW	Eslov	0,5		Svämvtmark och förbättring av tidigare åtgärd. Förprojekttering. Kan ev. tas vidare. Förprojekttering under höst 2024
U862	Stångby 1:2 m.fl.	EB	FH	Lund	1,5		Våtmark. 2023-11: Ny intresseanmälning våren 2023. Del av DF behöver tas bort. Förprojektteras och bedöms utifrån effektivitet/görbarhet. 2024-08: Dialog har förts med Länsstyrelsen. Lunds kommun samt MA om vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga samt hur dessa ska förhållas till det angränsande naturreservatet. 2024-09: Dialog fortskridit med MA, länsstyrelse, kommun och vattenråd. En möjlighet att inkludera projektet i Land4Climate undersöks.
S863	Dösjö - Elvågaröden 1:1	TD, EB	EB	Sjöbo	20		Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälning sommar 2023. 2023-11: Gods förutsättningar för stora vattenytor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenytor över 5 ha. 2024-03: Haft ett möte med MA om förutsättningar, ser positivt ut. Geoteknisk undersökning är genomförd. Bokat fältmöte med arrendator. 2024-08: förstudie fortskridit, inmätningar på vattennivåer har genomförts. 2024-09: Ytterligare data för vattennivåer väntas.
K766	Rinnebäck 1:55	FH		Kävlinge	0,5		2023-11: Möte med Kävlinge kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark för närliggande och gåddproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteras för kommunen och VR.
K865	Gnyet Kävlinge 34:21	BW	JK	Kävlinge	0,5		2024: En förstudie pågår där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Etta antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen.
U 789	Bro vid vadmöllan	FH		Eslov/Lund	-		2024: En förstudie har genomförts där möjligheterna att anlägga en gångbro över Kävlingeån undersöktes. De befintliga pontonerna vid Vadmöllan skulle då användas. Intresset hos vederbörande kommuner har dock varit svagt och det är inte troligt att det skulle vara möjligt att finansiera projektet. 2024-09: Resultatet av förstudien presenterades för BG och en rekommendation att lägga projektet på is antogs pga bristande intresse hos kommuner.
E867	Gnybybäck	FH, AJ		Eslov	-		2024-08: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojekttering fortskridit.
U866	Hobymölla	FH, AJ		Lund	-		2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen. Ytterligare förprojekttering fortskridit.
S868	Åsum-Lillås	TD, JK		Sjöbo	-		2024-09: Ett första möte med MA har genomförts. Intresse finns hos MA att skapa bevakningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdsåtgärder undersöks.
Detaljprojekttering							
Ö569	569 Hejdeholm (Rotsberga 7:7, Höbr) - Utebovninge kulvert	BW	FH	Höbr	0,5		2023-11: 670 m ny bäck + hölja grovprojekterad. Anläggning ev 2024. Utkast till avtal skickade till MA för ställningstagande. Förslag på markersättning ska ses över. 2024-01: Samråd med markägare sker
S839	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MI	HB	Sjöbo	0,5		Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projekttering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP. 2024-09: Dialogen kommer fortsätta under höst 2024.
S859	Projektering S859 Tolånga övre damme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån)	FH	HB (MWu?)	Sjöbo	-		Höga anbud i upphandling. Förhandling med entreprenör och markägare pågår. Entreprenad skjuts upp till 2024 pga ekonomi och kort tidsfönster för entreprenad (kräver låga flöden). 2023-12: Dialog med markägare pågår. Mål 2024: Åtgärda övre damme - avskänning och rep av luckor, ta bort fiskfälla m.m. Mål långsiktigt: Arbeta med nedre damme och ev översiling. 2024-09: Detaljprojekteringen har övergått till entreprenadkontroll.
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo		TA	Sjöbo	1,8		2024-01: Vattenverksamhet godkänd av Lst. Utformning av avtal är överenskommen med markägare, ska skrivas på. Dialog om stängling klar - markägare stängs. Geoteknisk undersökning är genomförd Upphandlingsunderlag håller på att skrivas. 2024-08: upphandling av entreprenör är klar, entreprenad ska starta under augusti. 2024-09: Detaljprojektering har övergått i entreprenadkontroll.
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd						Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekomydan för gåddor. 2024-03: Anbudsunderlag håller på att skrivas. Avslag för LONA-bidrag, dialog förs med Länsstyrelsen. 2024-08: Beslut togs tidigare på styrelsemöte att VR finansierar projektet själva. Entreprenör är upphandlad och entreprenaden ska starta under augusti. 2024-09: Detaljprojektering har övergått i entreprenadkontroll.

Entreprenadkontroll

Nr	Fastighet	Ansvarig	Kvalitets-			Yta	Längd	STATUS
			kontroll	Kommun				
S831, S837	Vanstad plankdämnets (831 och 837)	SW	TA (RN)	Sjöbo			Inbokad. 2023-10: Möte i fält 31/10 med entreprenör för att bestämma vad som ska göras. 2023-12: Extra plank ska vibreras ner i marken, på vissa delar ska duk läggas på uppströmsidan. Dialog förs med entreprenör. 2024-09: Åtgärder för att laga de skador som uppkom vintern 2023/2024 genomförs under hösten.	
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	Lund		5	2023-09: Sädd av gräs och örter, samt pluggplanter, utförd. Inventering i augusti. Utredning av problem med dräneringar. 2023-10: skötselplan görs /TA. 2023-11: Koll av dräneringar/flödesfördelning framgent. 2024-09: överlämning av skötsel till Lunds kommun är genomförd.	
S829	829 Brösarp 3:7 m.fl, Sjöbo	SW	MJ (TA)	Sjöbo		1,5	2024-01: Entreprenad pågår - samordnas med 849. Startmöte 25/8. Delbesiktning 12/11. Slutbesiktning senare ega höga grundvattennivåer, vissa arbeten måste göras vid lägre vattennivåer. 2024-01: Pågrund av översvämning vid höga flöden har en granne kontaktat länsstyrelsen och ett tillsynsärende har öppnats. En dialog förs med länsstyrelsen samtidigt som en utredning om orsak till översvämning pågår. En åtgärd vid utloppsbrunn är genomförd. Åtgärdsprogram har skickats till Länsstyrelsen, avvaktar beslut. 2024-08: Projektet är slutbesiktigt och avslutat.	
S849	849 Brösarp 4:15 m.fl, Sjöbo	MI	SW (TA)	Sjöbo		1	Entreprenad pågår - samordnas med 829 - se ovan. Vid denna vätmark har inga problem förekommit. 2024-08: Projektet är slutbesiktigt och avslutat.	
U400	Flödesdämpande åtgärder-Verberöd	TA	BW	Lund			2023-09: Entreprenad påbörjad. Test av olika lösningar på plankkonstruktioner under sommaren. Lösning med stående plank framtagen av E, tillägg på ca 400 kkr. 2023-12: Entreprenad färdigställd, men högföde 17/11 skadade planken. Skarbes skuts upp tills E har åtgärdat skador och fel. 2024-08: entreprenör genomför planerade ändringar. 2024-09: Entreprenör har genomfört åtgärder för skador på planken och slutbesiktning är genomförd och godkänd.	
O807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	Höör		40	2023-10: Entreprenad slutbesiktigt. 2023-12: Sättning av peglar klart, efterjusteringar för erosion kommer behöva göras (ävljar E). Fältbesök för kontroll av vattennivåer (kontrollprogram) görs regelbundet. 2024-09: Det återstående arbetet samt reparation planeras genomföras under hösten 2024.	
S861	Övedskloster 2:23, Lilla Torpsbäcken	HB	TW/TA	Sjöbo			2024-01: Entreprenad kommer återupptas till sommaren när vattennivåerna i Vombsjön är lägre. Enbart bentonit mattan till omlopet som kvarstår. Fiskräkare installeras först 2025. 2024-08: Entreprenör har återupptagit arbetet som planeras att avslutas under augusti månad. 2024-09: Entreprenör har färdigställt arbetet och slutbesiktning genomförd under september månad.	
S859	Tolunga övre damme (tidigare Vandringshinder Blörkaån Bråån)	FH	AJ	Sjöbo		-	2024-09: Entreprenad för att åtgärda vandringshindret är påbörjad och genomförs under hösten 2024.	
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd	TD	AJ, HB	Eslov			Två vätmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckens utlopp för att skapa lekomydan för gaddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024.	
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TD	Sjöbo		1,8	Två vätmarker och en bäck anläggs. 2024-09: Entreprenaden är påbörjad och genomförs under hösten 2024.	

Reparation underhåll

Pågående 2024							
Nr	Fastighet	Ansvarig	Kommun	Yta	Längd	Status	Övrigt
S51	Vallarum 13:4, Sjöbo	TD	Sjöbo				2023-11: Samordnas med Västerstad - Ev problem med massor på betesmark. Skårskau upphandlad för rensning sedan 2021 - utloppsreparation tillkommer förmodligen (nytt 2023-09). Tilläggsbeställning ska göras. 2024-09: reparationen är åtgärdat och avslutat.
H176	Västerstad 23:6, 23:7, Hörby	TD	Hörby				2023-11: Samordnas med Vallarum. Rep av utloppsbrunn och rensning av inlopp behövs. Relativt enkla åtgärder. Skårskau upphandlad sedan 2021 (dränering). Tilläggsbeställning gjord. 2024-09: Reparationen är åtgärdat och avslutat.
E806	Örtofta 21:1	TA	Eslov				2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivååtgärder (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängla - förslag att VR bestkar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ok m FE). 2024-03: Undersökning av läckage utfört i fält. 2024-09: utredning om läckage fortskrider.
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslov	FH	Eslov				2023-10: EG har gjort skiss på planeringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bestoka planteringen givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planeringsplan.
S529	ÖVEDSKLOSTER 2:23 (Ekeback)	HB	Sjöbo				Anlagd 2010. Samordnas med FokusVomb och tas i Lilla Torpsbäcken-entreprenaden. 2024-09: Reparationen är genomförd och inväntar besiktning.
S372	Blörka översilning - löpande	TA	HB	Sjöbo			Sjöbo kommun bestkar underhåll. VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024-09: Årsmöte är genomfört planerad provtagnings av dricksvattenbrunnar pågår.
S157	Voljö säteri	TD	BB	Sjöbo			Nytt pris 2023-04: 366 443 kr + 122 000 kr i ÅTA för transport av massor till upplag. 2023-10: VR söker externa medel för detta inför 2024. 2024-09: möjligheten att genomföra rensning av sediment undersöks.
E707	Källtorpsgården 1:21 (Skarhult)	JK	Eslov				2023-08: Grund besättningsdammen läcker. Utlopp eller vall mot dike. MÅ (Skarhult) har dessutom idé om att fördjupa, vilket VR inte kan bekosta. Samordnas med 708 och 25. Åtgärds 2024. 2024-09: Reparationen är genomförd och avslutat.
E708	Skarhult 13:10	JK	Eslov				Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bestkar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25. 2024-09: Reparation planeras genomföras under höst 2024.
E25	Skarhult 13:36	JK	Eslov				Dammen läcker och skulle behöva åtgärdas. Samordnas med med 707 och 708. 2024-09: Reparation planeras genomföras under hösten 2024.
E129	Slogstorp	TA	Eslov				Rensning av damm. 2024-09: Möjligheten att genomföra rensningen undersöks.
	Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare)						Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.

Utveckling och dialog

Dialogmöte - Harlösa Rotaryklubb	FH	-					FH och Therese P besöker Harlösa för dialog om vattenvårdsåtgärder. Prel datum 21/3. 2024: dialogmöte är genomfört
Framtiden för KVBS arbete	TA						Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden.
PFAS Fokusvombsjön	BB, TW						Vattenprovtagning i Vombsjön och Kävlingsån för PFAS. 2024-09: Provtagningen är genomförd och avslutat.
Överlämningsavtal anläggning	TA						Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal.
Ramavtal reparation och underhåll							framtagna av upphandlingsunderlag för ett ramavtal reparation och underhåll.
Uppdatera mallar anbudsunderlag							Uppdatering av de mallar som används till skrivning av anbudsunderlag till åtgärder.
Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken							Uppföljning av de fiskvårdsåtgärder som genomförs i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av fiskräkare. Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i rott . Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
