








Aktuella vattenvårdsprojekt årsredovisning 2023-2024

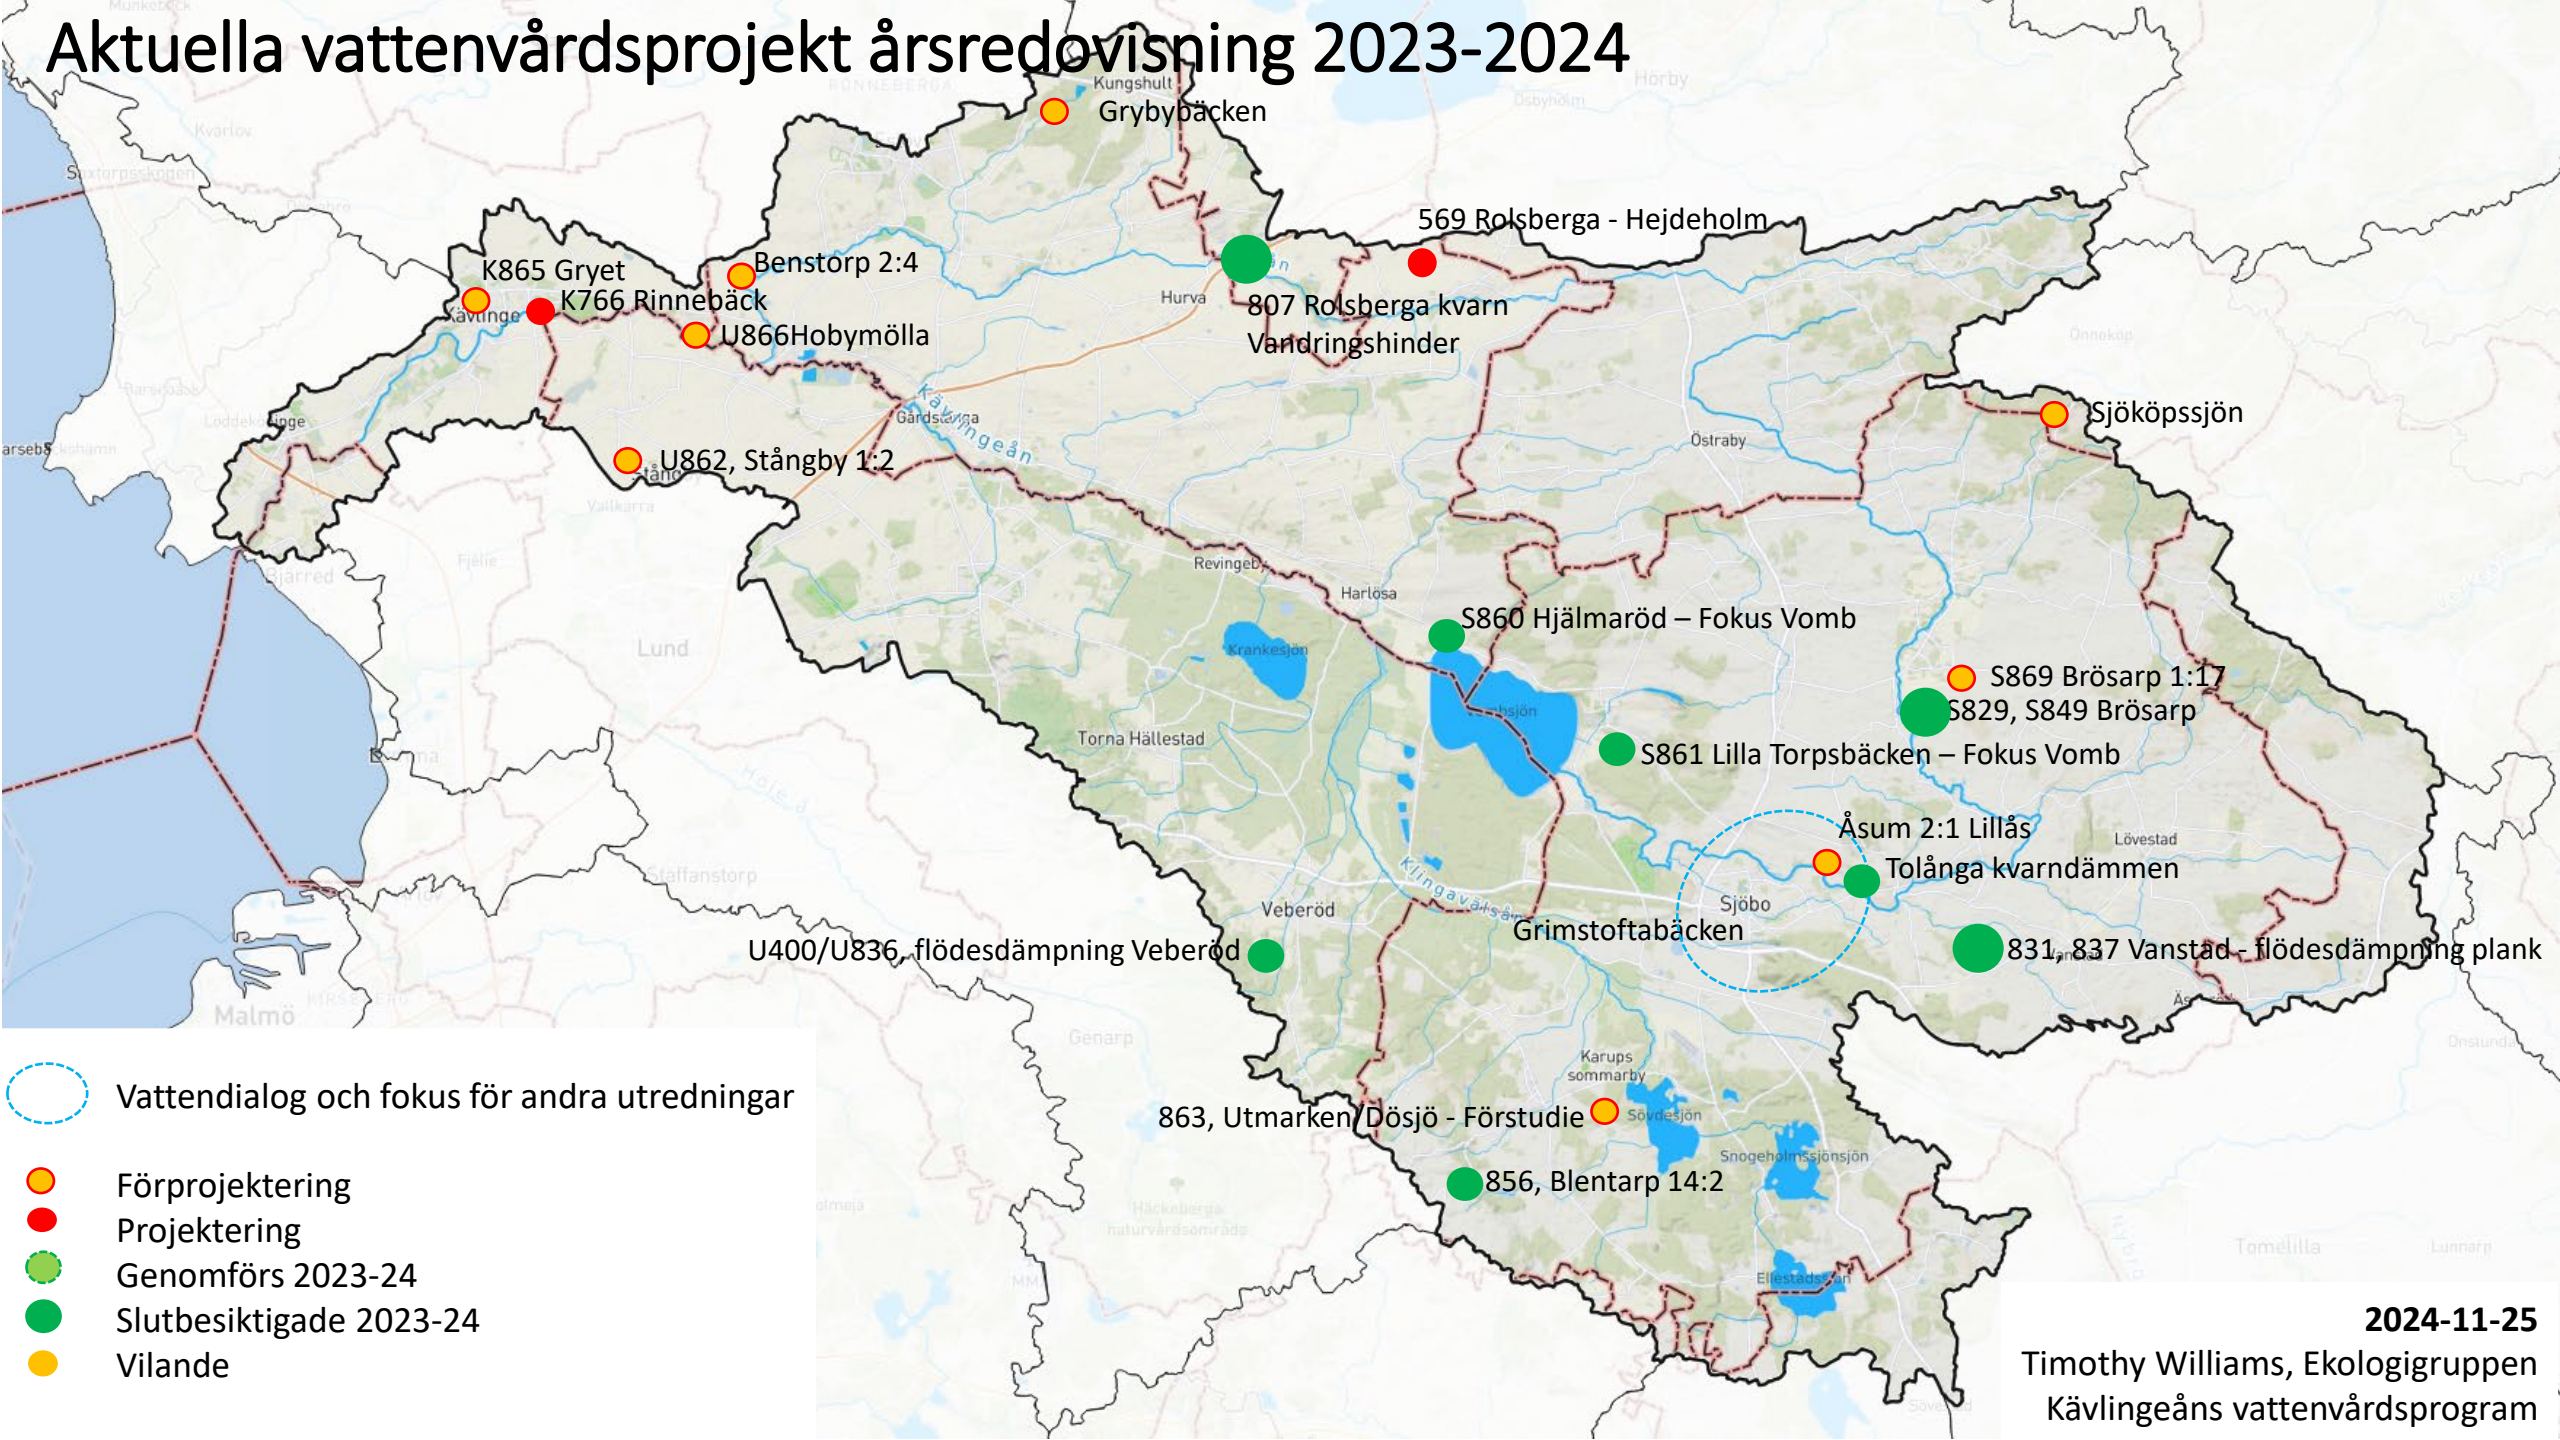

 Vattendialog och fokus för andra utredningar

-  Förprojektering
-  Projektering
-  Genomförs 2023-24
-  Slutbesiktigade 2023-24
-  Vilande

2024-11-25
Timothy Williams, Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag ”Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027”

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvitlock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dinkningsföretag, EG = Ekologigruppen, MÅ = markägare

Uppdaterad 2024-11-25

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Kvalitets-				Längd	STATUS
		Ansvarig	kontroll	Kommun	Yta		
Intresseanmälningar							
Inkomna intresseanmälningar och förprojektering							
		FH	TA	-	-	-	Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs.
Förprojektering 10-20 h/proj							
	Benstorp 2:4	TA	TW	Eslov	0,5		Svåmåtmark och förbättring av tidigare åtgärd. Förprojektering. Kan ev. tas vidare. Förprojektering under höst 2024
U862	Stångby 1:2 m.fl.	EB	FH	Lund	1,5		Våtmark. 2023-11: Ny intresseanmälning. Del av DF behöver tas bort. Förprojekteras och bedöms utifrån effektivitet/görbarhet. 2024-08: Dialog har förts med Länsstyrelsen, Lunds kommun samt MÅ om vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga samt hur dessa ska förhållas till det angränsande naturreservatet. 2024-09: Dialog fortskrider med MÅ, länsstyrelse, kommun och vattenråd. En möjlighet att inkludera projektet i Land4Climate undersöks. 2024-11: Åtgärden kommer kunna finansieras av medel från Land4Climate. Arbetet fortskrider.
S863	Dösjö - Etsagården 1:1	TD, EB	EB	Sjöbo	20		Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälan sommar 2023. 2023-11: Goda förutsättningar för stora vattenytor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenytor över 5 ha. 2024-03: Haft ett möte med MÅ om förutsättningar, ser positivt ut. Geoteknisk undersökning är genomförd. Bokad fältmöte med arrendator. 2024-08: Förstudie fortskrider, inmätning på vattennivåer har genomförts. 2024-09: Ytterligare data för vattennivåer inväntas. 2024-11: Lite problem med inmätning av vattenstånd i om försunnen mäturustning. Utredningen fortsätter med dialog med MÅ och utredning om åtgärdens utbredning.
K766	Rinnebäck 1:55	FH		Kävlinge	0,5		2023-11: Möte med Kävlinge kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med föreslag på våtmark för näringsrening och gäddreproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skottel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteras för kommunen och VR. 2024-11: Underlag till anmälan för vattenverksamhet tas fram. Kommunen har godkänt åtgärden och vill att vi ska gå vidare.
K865	Gryet Kävlinge 34:21	BW	JK	Kävlinge	0,5		2024: En förstudie pågår där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Ett antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen. 2024-11: Kommunen är positiv till åtgärden, kommer ta fram ett förslag för beslut av kommunstyrelsen för fortsatt arbete.
E867	Grybybäcken	FH, AJ		Eslov	-		2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider.
U866	Hobymölla	FH, AJ		Lund	-		2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider.
S868	Åsum-Lillås	TD, JK		Sjöbo	-		2024-09: Ett första möte med MÅ har genomförts. Intresse finns hos MÅ att skapa bevakningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdsåtgärder undersöks. 2024-11: Ett förslag är framtaget och skickat till vattenrådet. Åtgärden är tekniskt möjlig men det är en fråga om finansiering.
S869	Brösarp 1:17	JKdy		Sjöbo			2024-11: Ett möjligt våtmarksläge. Förslag skickat till MÅ.
H765	Sjököpsjön	FH		Hörby	10 ha		2024-11: Återövning av torv och höjning av sjön. En intresseanmälan har kommit in från en boende i närområdet. Möjligheten för att genomföra en åtgärd undersöks.
Detailprojektering							
O569	569 Hejdeholm (Rolsberga 7:7, Höbr) - Uppbrytning kulvert	BW	FH	Höör	0,5		2023-11: 670 m ny bäck + hölja grovprojekterad. Anläggning ev 2024. Utkast till avtal skickade till MÅ för ställningstagande. Förslag på markersättning ska ses över. 2024-01: Samråd med markägare sker
S839	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MJ	HB	Sjöbo	0,5		Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördupad projektering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP. 2024-11: Dialogen fortsätter under höst 2024.
S859	Projektering S859 Tolånga övre dämme (tidigare Vandringshinder Björkådn Bråån)	FH	HB (MWu?)	Sjöbo	-		Höga anbud i upphandling. Förhandling med entreprenör och markägare pågår. Entreprenad skjuts upp till 2024 pga ekonomi och kort tidsfönster för entreprenad (kräver låga flöden). 2023-12: Dialog med markägare pågår. Mål 2024: Åtgärda övre dämme - avsakning och rep av luckor, ta bort fiskfälla m.m. Mål långsiktigt: Arbeta med nedre dämme och ev översiling.
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TA	Sjöbo	1,8		2024-09: Detailprojekteringen har övergått till entreprenadkontroll. 2024-01: Vattenverksamhet godkänd av Lst. Utformning av avtal är överenskommet med markägare, ska skrivas på. Dialog om stängling klar - markägare stängs. Geoteknisk undersökning är genomförd Upphandlingsunderlag håller på att skrivas. 2024-08: upphandling av entreprenör är klar, entreprenad ska starta under augusti. 2024-09: Detailprojektering har övergått i entreprenadkontroll.
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd						Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekomyråden för gäddor. 2024-03: Anbudsunderlag håller på att skrivas. Avslag för LONA-bidrag, dialog förs med Länsstyrelsen. 2024-08: Beslut togs tidigare på styrelsemöte att VR finansierar projektet själva. Entreprenör är upphandlad och entreprenaden ska starta under augusti. 2024-09: Detailprojektering har övergått i entreprenadkontroll. 2024-11: Entreprenaden är avslutad och slutbesiktigad.

Entreprenadkontroll

Nr	Fastighet	Ansvarig	Kvalitets-			Yta	Längd	STATUS
			kontroll	Kommun				
S831, S837	Vanstad plankdämma (831 och 837)	SW	TA (RN)	Sjöbo			2023-09: Fortsatt koll på anläggningen behövs. Mindre åtgärder p.g.a. erosion kommer behövas. Möte med JKN inbokad. 2023-10: Möte i fält 31/10 med entreprenör för att bestämma vad som ska göras. 2023-12: Extra plank ska vibreras ner i marken, på vissa delar ska duk läggas på uppströmssidan. Dialog förs med entreprenör. 2024-09: Åtgärder för att laga de skador som uppkom vintern 2023/2024 genomförs under hösten. 2024-11: Åtgärderna är genomförda och entreprenaden är avslutad.	
U777	U777 Sandby	TA	SW/MW	Lund		5	2023-09: Sådd av gräs och örter, samt pluggplanter, utförd. Inventering i augusti. Utredning av problem med dräneringar. 2023-10: Skötselplan görs /TA. 2023-11: Koll av dräneringar/flödesfördelning framgent. 2024-09: Överlämning av skötsel till Lunds kommun är genomförd.	
U400	Flödesdämpande åtgärder-Verberöd	TA	BW	Lund			2023-09: Entreprenad påbörjad. Test av olika lösningar på plankkonstruktioner under sommaren. Lösning med stående plank framtagen av E, tillägg på ca 400 kkr. 2023-12: Entreprenad färdigställd, men höglöfde 17/11 skadade planken. Slutbes skuts upp tills E har åtgärdat skador och fel. 2024-08: entreprenör genomför planerade ändringar. 2024-09: Entreprenör har genomfört åtgärder för skador på planken och slutbesiktning är genomförd och godkänd. Ett uppföljningsprogram är framtaget.	
Ö807	Böstofta 19:3, Rolsberga kvarn	HB	FH	Höör		40	2023-10: Entreprenad slutbesiktigad. 2023-12. Sättning av peglar klart, efterjusteringar för erosion kommer behövas göras (ävlar E). Fällbesök för kontroll av vattennivåer (kontrollprogram) görs regelbundet. 2024-09: Det återstående arbetet samt reparation planeras genomföras under hösten 2024.	
S861	Övedskloster 2:23, Lilla Torpsbäcken	HB	TW/TA	Sjöbo			2024-01: Entreprenad kommer återupptas till sommaren när vattennivåerna i Vombsjön är lägre. Enbart bentonit mattan till omlöpet som kvarstår. Fiskräkare installeras först 2025. 2024-08: Entreprenör har återupptagit arbetet som planeras att avslutas under augusti månad. 2024-09: Entreprenör har färdigställt arbetet och slutbesiktning genomförd under september månad. 2024-11: Entreprenaden är avslutad och slutbesiktigad.	
S859	Tolänga övre damme (tidigare Vandringshinder Björkaån Bråån)	FH	AJ	Sjöbo			2024-09: Entreprenad för att åtgärda vandringshindret är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad.	
E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd	TD	AJ, HB	Eslöv			Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekomyråden för gäddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad.	
S856	Blentarp 14:2, Sjöbo	TW	TD	Sjöbo		1,8	Två våtmarker och en bäck anläggs. 2024-09: Entreprenaden är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenaden är avslutad och slutbesiktigad.	

Reparation underhåll

Pågående 2024

E806	Örtofta 21:1	TA		Eslöv			2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåvägare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängs-la - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (en tidigare ök m FE). 2024-03: Undersökning av läckage utförd i fält. 2024-09: utredning om läckage fortskridet.
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH		Eslöv			2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planteringsplan.
S529	ÖVEDSKLOSTER 2:23 (Ekeback)	HB		Sjöbo			Anlagd 2010. Samordnas med FokusVomb och tas i Lilla Torpsbäcken-entreprenaden. 2024-09: Reparationen är genomförd och inväntar besiktning. 2024-11: Reparationen är genomförd och slutbesiktigad.
S372	Björka översilning - löpande	TA	HB	Sjöbo			Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024-09: årsmöte är genomfört planerad provtagning av dricksvattenbrunnar pågår.
S157	Vollsjö säteri	TD	BB	Sjöbo			Nytt pris 2023-04: 366 443 kr + 122 000 kr i ÅTA för transport av massor till upplag. 2023-10: VR söker externa medel för detta inför 2024. 2024-09: möjligheten att genomföra rensning av sediment undersöks.
E708	Skarhult 13:10	JK		Eslöv			Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bekostar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25. 2024-09: Reparation planeras genomföras under höst 2024.
E25	Skarhult 13:36	JK		Eslöv			Dämet läcker och skulle behöva åtgärdas. Samordnas med med 707 och 708. 2024-09: Reparation planeras genomföras under hösten 2024.
E129	Slogstorp	TA		Eslöv			Rensning av damm. 2024-09: Möjligheten att genomföra rensningen undersöks.
	Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare)						Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.

Utveckling och dialog

Kontrollprogram Ö807 Rolsberga kvarn							Vattennivån och avbördning mäts vid det anlagda omlöpet.
Framtiden för KVRs arbete	TA						Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden.
Överlämningsavtal anläggning	TA						Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal.
Ramavtal reparation och underhåll							Framtagande av upphandlingsunderlag för ett ramavtal reparation och underhåll.
Uppdatera mallar anbudsunderlag							Uppdatering av de mallar som används till skrivning av anbudsunderlag till åtgärder.
Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken							Uppföljning av de fiskvårdsåtgärder som genomförts i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av en fiskräkare.
Uppföljning Verberöd plankdämma	BW						Uppföljning av plankdämmets effekt på höga flöden.
							Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i rött.
							Prognoserna ändras efter delprojektets fortskående samt då nya delprojekt dyker upp.
