


Aktuella vattenvårdsprojekt 2024-2027

*Reparation och underhåll ej inkluderat

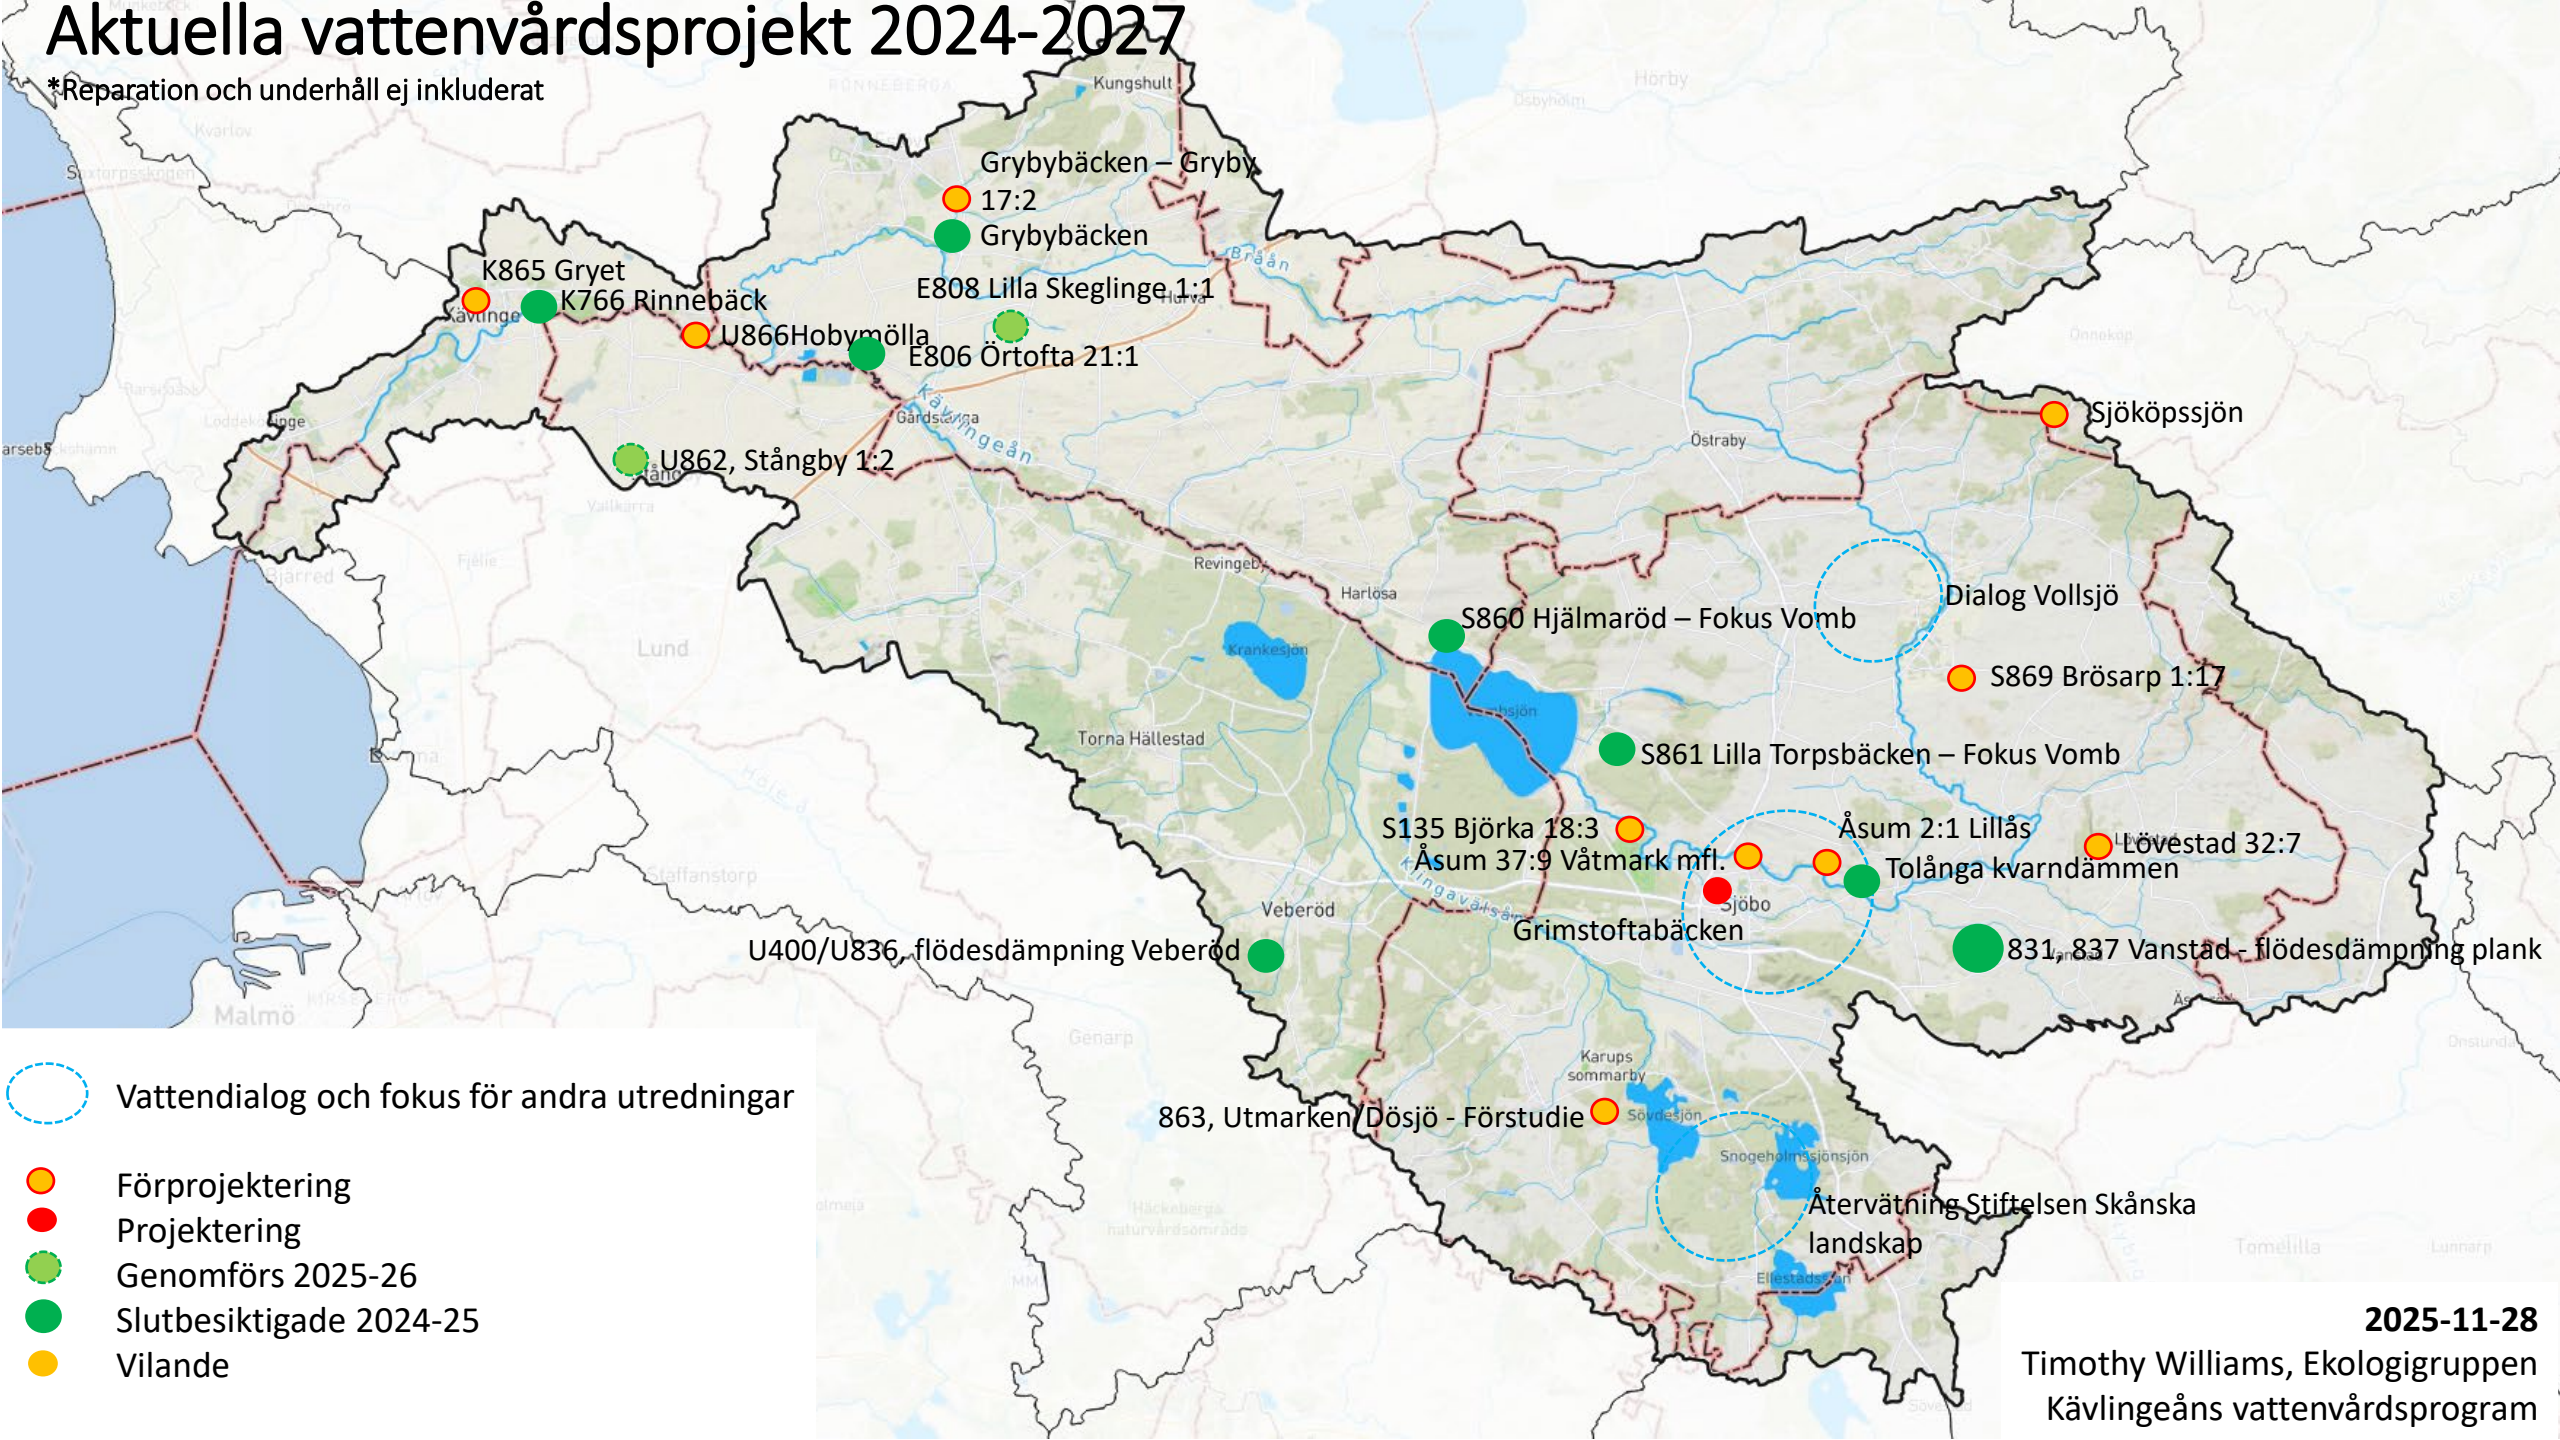

2025-11-28

Timothy Williams, Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag ”Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027”

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvitlock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MÅ = markägare

Uppdaterad 2025-11-28

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Kvalitets-				STATUS
		Ansvarig	kontroll	Kommun	Yta	
Intresseanmälningar						
	Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	FH	TA	-		Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs.

Förprojektering 10-20 h/proj

S863	Dösjö - Elsågården 1:1	TD, EB	EB	Sjöbo	20	Våtmarker på stort område. Ny intresseanmälan sommar 2023. 2023-11: Goda förutsättningar för stora vattenytor. Geoteknisk undersökning genomförd. Externa medel till förstudie ska sökas. Tillstånd i domstol krävs för vattenytor över 5 ha. 2024-03: Haft ett möte med MÅ om förutsättningar, ser positivt ut. Geoteknisk undersökning är genomförd. Bokat fältmöte med arrendator. 2024-08: förstudie fortskrider, inmätningar på vattennivåer har genomförts. 2024-09: Ytterligare data för vattennivåer inväntas. 2024-11: Lite problem med inmätning av vattenstånd i om försvunnen mätutrustning. Utredningen fortsätter med dialog med MÅ och utredning om åtgärdens utbredning. 2025-02: Ny mätutrustning för vattenståndsmätning är uppsatt för att ersätta den förlorade utrustningen. Möte planerat med MÅ. 2025-04: Dialogen fortsätter med MÅ. Diskussion pågår med skogsstyrelsen om möjlighet att bidra till återvätning i området. 2025-09: Under våren beslutades det att åtgärden skulle sättas på paus eftersom MÅ ansåg att de bidrag som var möjliga för honom att få inte berättigade anläggandet av åtgärden. Under sommaren meddelade dock jordbruksverket att ersättningen skulle höjas, därför ska det nu underökas om detta förbättrar förutsättningarna för MÅ att få ersättning för åtgärden. 2025-11: De nya höjda bidragen har inkluderats i förslaget och det har presenterats för MÅ. MÅ ansåg dock fortfarande att ersättningen var för låg. Eftersom det inte är möjligt att komma upp i en ersättningsnivå som MÅ är tillfredsställd med anser vi att projektet ska pausas/läggas på is tills vidare. 2025-12: Ett nytt försök i dialogen med MÅ har gjorts angående de ekonomiska förutsättningarna kring anläggning av åtgärder.
K865	Gryet Kävlinge 34:21	BW	JK	Kävlinge	0,5	2024: En förstudie pågår där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Ett antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen. 2024-11: Kommunen är positiv till åtgärden, kommer ta fram ett förslag för beslut av kommunstyrelsen för fortsatt arbete. 2025-02: En visionsbild är framtagen för att kommunicera potentialen av åtgärden för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver godkänna om åtgärden kan genomföras då den är belägen på kommunens mark samt om kommunen vill bidra för att även skapa rekreativa åtgärder vid platsen. Om åtgärden godkänns av kommunen kommer troligen även en utredning krävas av dikningsföretaget. 2025-03: Dialog förs med kommunen inför beslut av kommunstyrelse om fortsatt arbete. 2025-09: Denna åtgärd har tillfälligt pausats för att återuppta arbetet under 2026. 2025-12: Ett möte ska hållas med Kommunekolog på Kävlinge kommun i början av 2026 angående om, och i så fall när, en åtgärd kan genomföras.
U866	Hobymölla	FH, AJ		Lund	-	2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider. 2025-03: En av två MÅ är lite osäker på om han vill genomföra en åtgärd. Dialog förs med Eslövs golfklubb om möjlighet att genomföra åtgärd på deras fastighet istället för att åtgärden ska vara fortsatt kostnadseffektiv.
S868	Åsum-Lillås	TD, JK		Sjöbo	-	2024-09: Ett första möte med MÅ har genomförts. Interesse finns hos MÅ att skapa bevakningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdåtgärder undersöks. 2024-11: Ett förslag är framtaget och skickat till vattenrådet. Åtgärden är tekniskt möjlig men det är en fråga om finansiering. 2025-01: Det undersöktes om det finns några höga naturvärden kopplat till lång beteshävd på den relevanta ytan, inga höga värden kunde påvisas. 2025-02: Ett samrådsunderlag är framtaget och samråd kommer hållas med Länsstyrelsen under februari månad. Efter samrådet kommer MÅ vara uppdragsgivare och stå för kostnaden.
S869	Brösarp 1:17	SW, MJ		Sjöbo		2024-11: Ett möjligt våtmarksläge, förslag skickat till MÅ. 2025-02: Vattenståndsmätare är utsatt för att ytterligare kunna bedöma förutsättningarna för åtgärd. 2025-09: Bedömning ska göras under hösten för förutsättningarna att anlägga en åtgärd på platsen. 2025-11: Flödesmätningar har inhämtats och visar på att en åtgärd som anläggs med syftet närsrensning inte kommer vara kostnadseffektiv. Möjligheten att anlägga en åtgärd för andra syften, tex biologisk mångfald, utreds vidare.
H765	Sjököpssjön	BW, NS		Hörby	10 ha	2024-11: Återvätning av torv och höjning av sjön. En intresseanmälan har kommit in från en boende i närområdet. Möjligheten för att genomföra en åtgärd undersöks. 2025-02: LONA-medel har tilldelats vattenrådet för att genomföra denna åtgärd. Arbetet fortskrider. 2025-09: Under sommaren gjordes ett fält besök på platsen för att undersöka de hydrologiska förutsättningarna och för att genomföra en biologisk inventering för att se vilka arter som skulle kunna påverkas av en åtgärd. Det observerades relativt höga naturvärden på platsen och arbetet för att anpassa åtgärden för dessa naturvärden fortskrider. 2025-11: Förstudien är genomförd och ett förslag för en åtgärd har tagits fram. 2025-11: Enligt beslut från BG och Kansli så fortsätter arbetet för genomförande av åtgärd.
S135	Björka 18.3	TA	JK			2025-09: En förprojektering för lämpliga åtgärder på vattendragsstäckan genomförs.
	Grybybacken - Gryby 17:2	MJ	HB	Eslöv		2025-09: En förstudie är inledd för att undersöka möjlighet till åtgärder längs grybybacken på fastigheten Gryby 17:2. 2025-11: En förstudie har genomförts och resultatet har presenterats för Eslövs kommun och MÅ. Förstudien visar att det finns en potential att genomföra åtgärder i vattendraget bl.a. för att gynna fisk. Det togs ett beslut att inte gå vidare med förslagen på rekriationsmiljöer.
	Lövestad 32:7	TA, SW		Sjöbo		2025-02: Ett möjligt våtmarksläge en förstudie inleds.
	Åsum 37:9 Våtmark	EB		Sjöbo		2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av en våtmark.
	Åsum 37:9 Svämplan	FH		Sjöbo		2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av ett utökad svämplan vid Björkaån
	Åsum 37:9 Vattendrag	FH		Sjöbo		2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för återställandet av en del av en å-fåra i björkaån.

Detaljprojektering

K766	Rinnebäck 1:55	FH		Kävlinge	0,9	2023-11: Möte med Kävlinge kommun V45 om huvuvida vi ska gå vidare med föreslag på våtmark för näringsrening och gäddreproduktion. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteraas för kommunen och VR. 2024-11: Underlag till anmälan för vattenverksamhet tas fram. Kommunen har godänt åtgärden och vill att vi ska gå vidare. 2025-01: Anmälan vattenverksamhet är inskickad. Länsstyrelsen har godkänt finansieringen genom LOVA bidrag. 2025-02: Komplettering inskickad för anmälan om vattenverksamhet, inväntar beslut från Länsstyrelsen. 2025-03: Anmälan om vattenverksamhet är godkänd. Nästa steg är att skriva anbudsunderlag för upphandling av entreprenör. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren. Startmöte för entreprenad hölls i augusti och abetet är pågående.
E867	Grybybäcken	FH, AJ		Eslöv	-	2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider. 2025-02: Åtgärdsförslag håller på att skapas. Dialog med markägaren förs om hur åtgärden ska genomföras. 2025-03: Projektering är genomförd och MÅ ställer sig positiv till att åtgärden genomförs i år men dialog förs med Lst om möjlighet att få finansiering med fiskevårdsmedel. 2025-04: Fältbesök genomfört med Lst, inväntar beslut om fiskevårdsmedel. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren och startmöte med upphandlad entreprenör hölls i augusti. Arbetet är pågående.
S871	Grimstofta åtgärdspaket	MJ				2025-09: Åtgärdsförslagen som togs fram genom Grimstofta dialogen detaljprojekteras. 2025-12: Arbetet fortskrider med detaljprojektering. Planen är att genomföra åtgärderna höst 2026.

Entreprenadkontroll

Nr		Fastighet	Ansvarig	Kvalitets-kontroll	Kommun	Yta	Längd	STATUS
E860		Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd	TD	AJ, HB	Eslöv			Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekområden för gäddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad. 2025-09: Ett behov av att reparera utloppet från erosionsskador har uppstått. En utredning av omfattningen genomförs samt dialog med entreprenör. 2025-12: Det arbete som krävs för att åtgärda problemen med utloppet till våtmarkerna planeras genomföras höst 2026.
K766		Rinnebäck 1:55	FH		Kävlinge	0,9		2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren. Startmöte för entreprenad hölls i augusti och abetet är pågående. 2025-11: Entreprenaden är slutförd och slutbesiktigad. Det återstår några fel som konstaterades på slutbesiktningen som ska åtgärdas av entreprenören under hösten.
E867		Grybybäcken	FH, AJ		Eslöv	-		2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren och startmöte med upphandlad entreprenör hölls i augusti. Arbetet är pågående. 2025-11: Entreprenaden är slutförd och slutbesiktigad.

Reparation underhåll

Pågående 2025

E806	Örtofta 21:1	TA		Eslöv		2023-11: Dammen läcker fortfarande. Kontroll av vattennivå i damm fortsätter, nivåmätare (divers) behöver sättas ut för att följa läckaget. MÅ vill stängsla - förslag att VR bekostar den del av stänglet som går runt dammen. Plantering är påbörjad av MÅ (enl tidigare ök m FE). 2024-03: Undersökning av läckage utfört i fält. 2024-09: Utredning om läckage fortskrider. 2025-01: Entreprenaden för installering av dräneringsrör i närliggande ålkärr påbörjades i december. Dräneringsröret behövs pga höga vattennivåer som skadar alarna. 2025-03: Entreprenaden är genomförd och avslutad. En nivåmätare är installerad för att följa upp att de önskvärda nivåerna hålls.
E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH		Eslöv		2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planteringsplan. 2025-03: MÅ har godkänt planteringsplan. Nästa steg är att handla upp entreprenör. 2025-09: entreprenör handlades upp under sommaren o arbetet är planerat att genomföras i höst. 2025-12: Planteringen är genomförd. Insådden kommer göras av MÅ och intruktioner är överlämnade.
S372	Björka översilning - löpande	TA	HB	Sjöbo		Sjöbo kommun bekostar underhåll, VR administrerar. 2023: EG är skötselrådets kontakt gällande skötselbehov. Entreprenör ramavtalad med Sjöbo kommun används, på lång sikt skulle en och samma entreprenör helst användas, en utmaning sett till LOU. 2024-09: Årsmöte är genomfört planerad provtagning av dricksvattenbrunnar pågår. 2025-03: Provtagnig av dricksvattenbrunnar är genomförd och avslutad.
U186	Igellösa	JK		Eslöv		Reparera dränering som skadades vid anläggning. Överenskommelse: VR bekostar 50% och MÅ 50%. MÅ fakturerar VR. MÅ har också ställt frågan om fördjupning av dammen, vilket VR inte kan bekosta, kan dock vara aktuellt för MÅ ändå. Samordnas med 707 och 25. 2024-09: Reparation planeras genomföras under höst 2024. 2025-09: eftersom omfattningen av reparationen bedöms som relativt stor har reparationen av denna åtgärd skjutits till 2026.
	Plan för reparation och underhåll 2026	SW				En inventering av behovet av reparation och underhåll av åtgärder, besiktning av åtgärder samt en plan för de rep och underhåll entreprenader som ska genomföras under 2026 tas fram.
E46	Holmby 7:4	MJ		Eslöv		2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationena av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten. 2025-11: Reparationen av våtmarken är genomförd och besiktigad.
E244	Gårdsstånga 17:5	MJ		Eslöv		2025-09: Behovet av reparation undersöktes och bedömdes finnas. Arbetet bedömdes dock som komplicerat på grund av att de massor som ska hanteras potentiellt kan vara förorenade, därför skjuts reparationen upp till kommande år då möjligheterna för genomförande bedöms som bättre.
E253A	Hjularöd 1:2	MJ		Eslöv		2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationena av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten. 2025-12: Reparationen är genomförd och besiktigad.
L767	Löddenäs 1:1	MJ		Lomma		2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationena av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten. 2025-12: Reparationen är genomförd och besiktigad.
L549	Önnerup 33:2	MJ		Lomma		2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationena av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten.
S12A	Åsum 37:9	MJ		Sjöbo		2025-09: En bedömning av behovet av reparation är gjord. Då omfattningen är relativt stor så är reparationen av åtgärden framflyttad till 2026. 2025-12: Reparationen kunde inkluderas i 2025 års reparationer och är genomförd och besiktigad.
E810	Hunneberga 31:2	MJ		Eslöv		2025-11: Damvallen hade börjat läcka. Åtgärden inkluderades i reparation och underhåll 2025. Entreprenaden är slutförd.
	Ytterligare i behov av rep/underhåll - (anmälda av markägare)			-		Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.

Utveckling och dialog

5839	Kontrollprogram Ö807 Rollsberga kvarn					Vattennivån och avbördning mäts vid det anlagda omlöpet. 2025-12: Mätningen är pausad för tillfället eftersom MÅ har ändrat utloppet från det utlopp som anlades av VR. Detta påverkar avbördningen och resultatet från mätningen.
	Framtiden för KVRs arbete	TA				Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden. Arbetet har fortsatt i form av ett flertal dialoger med beredningsgrupp och styrelse.
	Överlämningsavtal anläggning	TA				Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal.
	Ramavtal reparation och underhåll					framtagande av upphandlingsunderlag för ett ramavtal reparation och underhåll. 2025-03: En extern upphandlingskonsult kommer kolla på ramavtalet, avvaktar tillsvidare.
	Uppdatera mallar anbudsunderlag					Uppdatering av de mallar som används till skrivning av anbudsunderlag till åtgärder. Detta arbete har en extern upphandlingskonsult upphandlad av VR fortsatt med.
	Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken					Uppföljning av de fiskvårdsåtgärder som genomförts i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av en fiskräknare. 2025-02: Fiskräknaren planeras att installeras under ferbuari. 2025-03: Fiskräknaren är installerad. 2025-09: Fiskräknaren monterades ner i juni och förvaras på Vombverket. Planen är att installera den i omlöpet i december för att fortsätta uppföljningen av omlöpet. 2025-12: instalation av Fiskräknaren planeras i början av december. En dialog med forskare på LU har förts om möjligheten av samarbete där LU skulle hjälpa till med genomförandet av uppföljningen.
	Uppföljning Veberöd plankdämme	BW				Uppföljning av plankdämmets effekt på höga flöden.
	Grimstoftabäcken - dialog, Sjöbo	MJ	HB	Sjöbo	0,5	Möjlighet till mindre vattenvårdsåtgärder finns på flera ställen. Dialog med kommunen om FÖP Sjöbo - ev har kommunen behov av fördjupad projektering på ett objekt för att få in det i FÖP. Långsiktigt arbete, balanseras mot kommunala intressen. 2023-10: Möte med Sjöbo kommun 25/10. Åtgärdsförslag sammanställs under hösten. Vissa åtgärder kan tas vidare inom KVVP, andra kan kommunen integrera i FÖP. 2024-11: Dialogen fortsätter under höst 2024. 2025-01: Dialogen försätter under 2025. 2025-03: Dialogen är till stor del genomförd. Möjliga åtgärder projekteras. 2025-04: möjligheten till att genomföra en del av åtgärderna under 2025 undersöks. 2025-09: Dialogen är i stort sett avslutad och de åtgärder som dialogen resulterat detaljprojekteras.
	Återvätning stiftelsen Skånska Landskap					Dialog för med MÅ (stiftelsen skånska landskap) och möjliga åtgärder undersöks, fokus för åtgärder kommer vara återvätning och fördröjning. Projektet är finansierat med LONA medel. 2025-04: Ett första dialogmöte har genomförts med stiftelsen. Ett ambitionsmål, metod för genomförande håller på att tas fram. 2025-09: Arbetet med utredningen är påbörjat och kommer fortgå till våren 2026 enligt preliminär plan. Arbetet innefattar en utredning av möjligheterna till total hydrologisk restaurering på fastigheten Ellestad 5:4. Arbetet kommer resultera i en åtgärdsplan för möjliga åtgärder på fastigheten. 2025-11: Under hösten har fältarbetet för projektet genomförts och är avslutat. En fältdag med Stiftelsen och vattenrådet har också genomförts. 2025-12: En dialog med MÅ och VR har hållits där datan från besiktning presenterades och det forsatta arbetet diskuterades.
	Återvätning GIS-studie					En undersökning av potentiella områden för återvätning i Kävlingeåns avrinningsområde. Projektet är finansierat med LONA medel.
	Förnyat samarbetsavtal	TA				2025-09: Ett förslag till nytt samarbets avtal för vattenrådet är framtaget.
	Dialog Vollsjö	TA				2025-09: En dialog ska genomföras med ett antal markägare runt Vollsjö. Arbetet kommer startas under hösten 2025. 2025-11: Arbetet fortskrider och ett datum för dialogmötet är satt.
Nya delprojekt samt ändrade siffror för prognos av tidsåtgång visas i rött . Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.						
