


Aktuella vattenvårdsprojekt 2024-2027

*Reparation och underhåll ej inkluderat

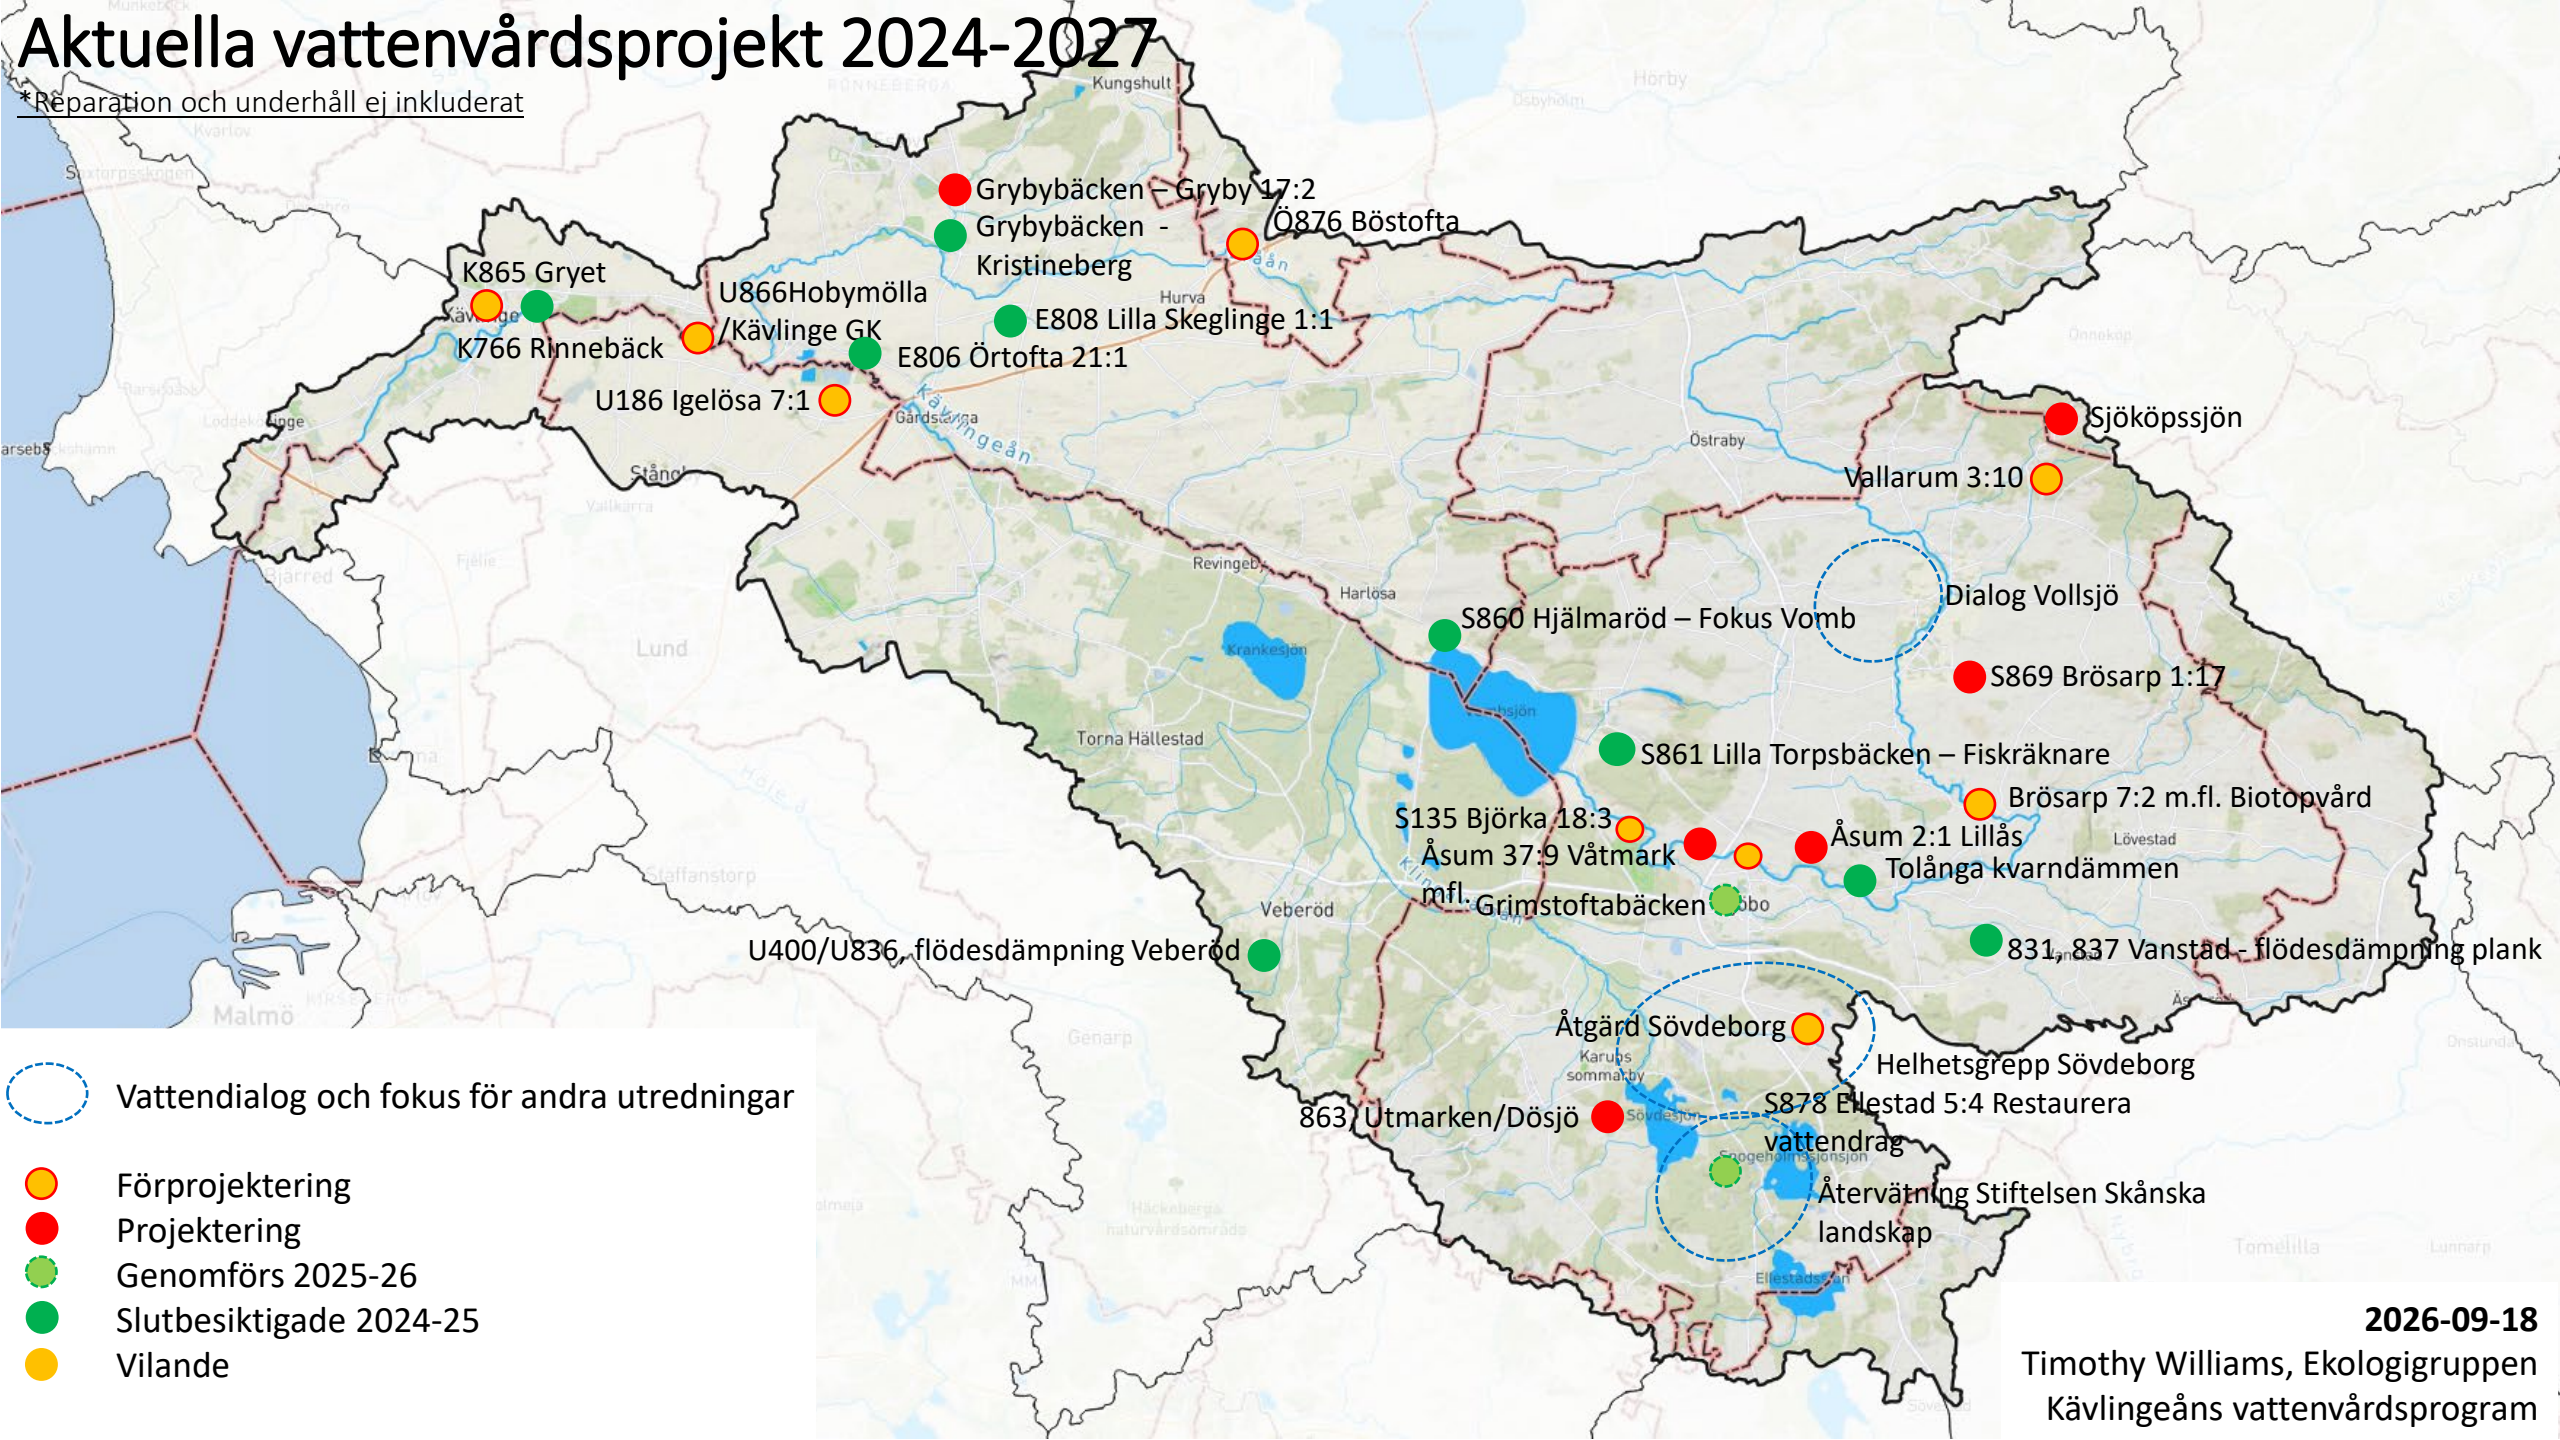

2026-09-18

Timothy Williams, Ekologigruppen
Kävlingeåns vattenvårdsprogram

KVVP, Uppdrag ”Genomförande av Kävlingeåns vattenvårdsprogram 2024-2027”

Uppdragsansvarig och projektledare: Filip Hvitlock
Projektsamordnare: Timothy Williams
Kvalitetsansvarig: Tette Alström

Förkortningar: VR = vattenrådet, DF = dikningsföretag, EG = Ekologigruppen; MÅ = markägare
Nya delprojekt visas i **rött**.
Prognoserna ändras efter delprojektens fortgående samt då nya delprojekt dyker upp.
Uppdaterad 2026-09-18

Pågående delprojekt

Nr	Fastighet	Ansvarig EG	Ansvarig kansli	Kommun	Yta	Längd	Skede / avslutat datum	STATUS
Intresseanmälningar								
	Inkomna intresseanmälningar och förprojektering	FH	TP, CB, IH	-				Nya intresseanmälningar inkommer löpande. Fler möjliga delprojekt övervägs.

Våtmarker (Näringsrening, Biol. Mångf. m.m)

E860	Harlösa-Hjälmaröd 9:1, Hjälmaröd	AJ	TP	Eslöv			Tilläggsbeställning	Två våtmarker ska anläggas vid Hjälmarödsbäckesutlopp för att skapa lekområden för gäddor. 2024-09: Entreprenad är påbörjad och genomförs under hösten 2024. 2024-11: Entreprenad är avslutad och slutbesiktigad. 2025-09: Ett behov av att reparera utloppet från erosionsskador har uppstått. En utredning av omfattningen genomförs samt dialog med entreprenör. 2025-12: Det arbete som krävs för att åtgärda problemen med utloppet till våtmarkerna planeras genomföras höst 2026. 2026-03: Planering inför att åtgärda utlopp till våtmark pågår. 2026-04: Stängsling runt våtmarken sker under våren. 2026-08: En tilläggsbeställning har skickas till entreprenör för att åtgärda utloppet till våtmarken. Genomförandet kommer ske under höst 2026.
K766	Rinnebäck 1:55	JK	TP	Kävlinge	0,9		Utförd (nov 2025)	2023-11: Möte med Kävlinge kommun om huvuvida vi ska gå vidare med förslag på våtmark. Kommunen positiv, inmätning ska ske. 2023-12: Projektförslag skickat till kommunen för ställningstagande. 2024-01: Kommunen är positiv men frågan om skötsel ska tas upp i kommunstyrelsen. 2024-08: ett förslag har tagits fram och ska presenteraas för kommunen och VR. 2024-11: Underlag till anmälan för vattenverksamhet tas fram. Kommunen har godänt åtgärden och vill att vi ska gå vidare. 2025-01: Anmälan vattenverksamhet är inskickad. Länsstyrelsen har godkänt finansieringen genom LOVA bidrag. 2025-02: Komplettering inskickad för anmälan om vattenverksamhet, inväntar beslut från Länsstyrelsen. 2025-03: Anmälan om vattenverksamhet är godkänd. Nästa steg är att skriva anbudsunderlag för upphandling av entreprenör. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren. 2026-01: Entreprenad utfördes hösten 2025. Besiktning är gjord. Plantering är gjord. Detaljer kring återställning och plantering kvarstår. 2026-08: Återställning och plantering är genomförd. Garantiskötsel av plantering fortgår till höst 2027.
U866	Hobymölla/Kävlinge GK	FH, AJ	IH	Lund	-		Förprojektering	2024-2025: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra ett antal åtgärder på platsen, men åtgärderna är för små för att kostnadseffektivitet ska uppnås. Ytterligare projektering fortskrider. Dialog förs med Kävlinge golfklubb om möjlighet att genomföra åtgärd på deras fastighet också för att åtgärden ska vara fortsatt kostnadseffektiv. 2026-01: Förslag på bredare projekt har skickat till kansli/BG för ställningstagande. 2026-03: Möjlig finansiering av projektet utreds av EG. Däremot har EG fått i uppdrag att hjälpa FVO med lekgrus och habitat förbättring. 2026-05: WWF tillfrågade - ej svarat. 2026-06: WWF svarade och gav avslag på finansiering men de rekommenderade att söka medel inom STERF, Detta undersöks nu.
K865	Gryet Kävlinge 34:21	JK	TP	Kävlinge	0,5		Förprojektering	2024: Förstudie där möjliga åtgärder undersöks. Även möjligheten att inkludera rekreation undersöks. 2024-09: Ett antal förslag på möjliga åtgärder har tagits fram och ska presenteras för kommunen. 2024-11: Kommunen är prositiv till åtgärden, kommer ta fram ett förslag för beslut av kommunstyryrelsen för fortsatt arbete. 2025-02: En visionsbild är framtagen för att kommunicera potentialen av åtgärden för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver godkänna om åtgärden kan genomföras då den är belägen på kommunens mark samt om kommunen vill bidra för att även skapa rekreativa åtgärder vid platsen. Om åtgärden godkänns av kommunen kommer troligen även en utredning krävas av dikningsföretaget. 2025-03: Dialog förs med kommunen inför beslut av kommunstyrelse om fortsatt arbete. 2025-09: Denna åtgärd har tillfälligt pausats för att återuppta arbetet under 2026. 2025-12: Ett möte ska hållas med Kommunekolog på Kävlinge kommun i början av 2026 angående om, och i så fall när, en åtgärd kan genomföras. 2026-06: Efter valet kan kommunen bestämma om de vill gå vidare. 2026-08: Förslaget ska tas upp i KS i slutet av sommaren. 2026-09: Det finns nu ett godkännande från kommunstyrelsen att fortsätta med projektet. Medel för att fortsätta arbetet kommer sökas.
S863	Dösjö - Elsågården 1:1	TD, EB	CB	Sjöbo	100		Projektering/Tillståndsansökan	Våtmarker på relativt stort område men både åkermark och skog. 2023-25 Projektering av större våtmarksyta. 2025-09: Under våren beslutades det att åtgärden skulle sättas på paus eftersom MÅ ansåg att de bidrag som var möjliga för honom var för låga. Under sommaren meddelade dock jordbruksverket att ersättningen planeras höjas.2025-11: De nya höjda bidragen har inkluderats i förslaget och det har presenterats för MÅ. MÅ ansåg dock fortfarande att ersättningen var för låg. Eftersom det inte är möjligt att komma upp i en ersättningsnivå som MÅ är tillfredsställd med anser vi att projektet ska pausas/läggas på is tillsvidare. 2026-01: Ett nytt försök i dialogen med MÅ har gjorts angående de ekonomiska förutsättningarna kring anläggning av åtgärder. MÅ är nu försiktigt positiv och vi planerar att se om vi kan komma framåt genom vidare dialog. 2026-02: Dialog fortsätter med MÅ. Olika typer av åtgärder utreds bl.a. pluggning av dränering, fuktångar och grodvatten. 2026-03: Ett försök att plugga dräneringarna har genomfört för att se påverkansområdet. Hur detta påverkar möjligheterna till ekonomisk ersättning till MÅ utreds. 2026-04: Testpluggning av dräneringen visade på goda förutsättningar att kunna skapa åtgärdsytor. Projektering fortsätter, samt utredningom att söka tillstånd för åtgärd och finansiering av genomförande. 2026-05: LONA för tillståndsansökan sökt. 2026-08: Avvaktar svar för ny LONA ansökan. Redovisning inskickad för LONA bidrag för förprojektering. 2026-09: LONA-medel för detaljprojektering och tillståndsansökan har beviljats.
S868	Åsum-Lillås	TD, JK	TP	Sjöbo	-		Tillståndsansökan	2024-09: Ett första möte med MÅ har genomförts. Intresse finns hos MÅ att skapa bevattningsmöjligheter. Potentialen att kombinera med vattenvårdåtgärder undersöks. 2024-11: Ett förslag är framtaget och skickat till vattenrådet. Åtgärden är tekniskt möjlig men det är en fråga om finansiering. 2025-01: Det undersöktes om det finns några höga naturvärden kopplat till lång beteshävd på den relevanta ytan, inga höga värden kunde påvisas. 2025-02: Ett samrådsunderlag är framtaget och samråd kommer hållas med Länsstyrelsen under februari månad. Efter samrådet kommer MÅ vara uppdragsgivare och stå för kostnaden. 2026-01: Undersökningssamrådet resulterade i icke betydande miljöpåverkan. En del frågor kring flödesdynamiken behöver utredas innan handlingar kan skickas till domstol.
S874	Åsum 37:9 Våtmark	EB, SW	IH	Sjöbo			Detaljprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av en våtmark.2026-03: Förstudie pågår.2026-04: Projektering fortsätter. Åtgärden planeras att anläggas med undantagsregeln, dvs att ingen anmälan för vattenverksamhet kommer sökas.2026-08: Anbudet ligger ute för upphandling. Åtgärden planeras genomföras under hösten 2026.
S874	Åsum 37:9 Svämplan	SW, EB	IH	Sjöbo			Detaljprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för anläggandet av ett utökat svämplan vid Björkaån 2026-03: Förstudie pågår. 2026-06: Projektering återupptas på allvar först efter att avtal skrivits om anläggning av åsum våtmark.
H765	Sjököpsjön	BW, NS	TP	Hörby	10		Detaljprojektering	2024-11: Återvätning av torv och höjning av sjön. En intresseanmälan har kommit in från en boende i närområdet. Möjligheten för att genomföra en åtgärd undersöks. 2025-02: LONA-medel har tilldelats vattenrådet för att genomföra denna åtgärd. Arbetet fortskrider. 2025-09: Under sommaren gjordes ett fält besök på platsen för att undersöka de hydrologiska förutsättningarna och för att genomföra en biologisk inventering för att se vilka arter som skulle kunna påverkas av en åtgärd. Det observerades relativt höga naturvärden på platsen och arbetet för att anpassa åtgärden för dessa naturvärden fortskrider. 2025-11: Förstudien är genomförd och ett förslag för en åtgärd har tagits fram. 2025-11: Enligt beslut från BG och Kansli så fortsätter arbetet för genomförande av åtgärd. 2026-01: Möte i fält med Lst och MÅ (Sveaskog planeras i januari. 2026-02: Ett möte har skett med Lst där de de generellt ställer sig positiva till åtgärden men hade några frågor som ska besvaras. Ett möte i fält med MÅ och en entreprenör hölls också MÅ ställer sig positiv till åtgärd. 2026-03: Detaljprojektering pågår. 2026-04: Entreprenad höst 2026. 2026-08: Samråd har skett med Lst för godkännande av finansiering genom LONA. Anmälan om vattenverksamhet samt ingrepp i kulturmiljö är inskickad. Åtgärden planeras genomföras under sen höst.

S869	Brösarp 1:17	SW, MJ	TP	Sjöbo			Detaljprojektering	2024-11: Ett möjligt våtmarksläge, förslag skickat till MÅ. 2025-02: Vattenståndsmätare är utsatt för att ytterligare kunna bedöma förutsättningarna för åtgärd. 2025-09: Bedömning ska göras under hösten för förutsättningarna att anlägga en åtgärd på platsen. 2025-11: Flödesmätningar har inhämtats och visar på att en åtgärd som anläggs med syftet näringsrening inte kommer vara kostnadseffektiv. Möjligheten att anlägga en åtgärd för andra syften, tex biologisk mångfald, utreds vidare. 2026-01: Biologisk mångfald i kombination med näringsrening kan vara skäl att genomföra åtgärden, då djurgård ingår i tillrinningsområdet. 2026-03: Detaljprojektering pågår. 2026-04: Detaljprojektering pågår. Åtgärden planeras anläggas med undantagsregeln, dvs att ingen anmälan för vattenverksamhet kommer sökas. 2026-06: Eftersom en stenmur som bedöms påverkas av åtgärden hittades vid platsen ändrades förutsättningen och en anm vv ska nu sökas. Detta skjuter på tidsplanen för åtgärden något.
Ö876	Böstofta 19:3	TD	IH	Höör	1,5		Detaljprojektering	2026-01: Potential finns att anlägga cirka 1,5 h sidovåtmark invid Bråån. Förprojektering påbörjad. 2026-06: MÅ drar sig ur projektet. Han ska sälja fastigheten och vill inte vara fast i ett projekt under den processen.
U186	Igelösa 7:1	SW	CB	Lund			Förprojektering	Utökning av befintlig våtmark 2026-04: Förprojektering pågår
	Sövdeborg åtgärd	TD	TP	Sjöbo			Förprojektering	2026-06: MÅ har pekat ut tre lägen som han anser är lämpliga. EG ska undersöka vilket som vi ska jobba vidare med. Annan konsult har tidigare gjort projekteringa för dessa lägen inom SP-plan. VR ha beslutat att vi istället ska ta dessa projekt inom VR regi. 2026-08: Dialog fortsätter med MÅ. Troligen kommer MÅ gå vidare med en våtmark inom SP i egen regi.

Vattendragsåtgärder

	Grybybäcken - Gryby 17:2	FH	TP	Eslöv			Förprojektering	2025-09: En förstudie är inledd för att undersöka möjlighet till åtgärder längs Grybybäcken på fastigheten Gryby 17:2. 2025-11: En förstudie har genomförts och resultatet har presenterats för Eslövs kommun och MÅ. Förstudien visar att det finns en potential att genomföra åtgärder i vattendraget bl.a. för att gynna fisk. Det togs ett beslut att inte gå vidare med förslagen på rekreationsmiljöer. 2026-01: Arbeta med reviderat förslag sker. 2026-03: Kostnadsberäkningar på förslag har skickats till kansli, kommun och MÅ. 2026-05: Klartecken från kommun att fortsätta med projektet, EG börjar detaljprojektering höst 2026, entreprenad är planerad för höst 2027.
E867	Grybybäcken-Kristineberg	FH	TP	Eslöv	-		Entreprenad	2024-09: Ett första fältbesök har genomförts. Det finns potential att genomföra åtgärd på platsen. Ytterligare förprojektering fortskrider. 2025-02: Åtgärdsförslag håller på att skapas. Dialog med markägaren förs om hur åtgärden ska genomföras. 2025-03: Projektering är genomförd och MÅ ställer sig positiv till att åtgärden genomförs i år men dialog förs med Lst om möjlighet att få finansiering med fiskevårdsmedel. 2025-04: Fältbesök genomfört med Lst, inväntar beslut om fiskevårdsmedel. 2025-09: Upphandling av entreprenör genomfördes under sommaren och startmöte med upphandlad entreprenör hölls i augusti. 2026-01: Entreprenad utfördes under hösten 2025 och är besiktigas och klar. Plantering gjordes i december. Manuellt arbete med återförsel av block är planerat efter sommaren 2026.
S871	Grimstoftabäcken åtgärdspaket	MJ	CB	Sjöbo			Entreprenad	2025-09: Åtgärdsförslagen som togs fram genom Grimstofta dialogen detaljprojekteras. 2025-12: Arbetet fortskrider med detaljprojektering. Planen är att genomföra åtgärderna höst 2026. 2026-02: Dialog förs med Lst om finansiering inom LOVA och även fiskevårdsmedel ha sökts. 2026-03: Alla åtgärder utom en sedimentationsdamm har godkänts inom LOVA. Svar om sökta fiskevårdsmedel återstår. 2026-04: De sökta fiskevårdsmedel fick avslag men Lst godkände istället att åtgärderna kunde finansieras inom LOVA. Därför kommer samtliga åtgärder som genomförs finansieras inom LOVA. 2026-06: Upphandling av entreprenör pågår. 2026-08: Entreprenad påbörjades tidig augusti. Besiktning av genomförd entreprenad är planerad till tidig september.
S875	Åsum 37:9 Vattendrag	AJ	IH	Sjöbo			Förprojektering	2025-12: Efter ett fältbesök för en intresseanmälan inleds en förstudie för återställandet av en del av en å-fåra i björkaån. 2026-04: Åtgärden fortsätts utredas men för att kunna genomföra den för rimlig kostnad måste den ske inom entreprenad av våtmarken eller svämplanet på samma fastighet.
S878	Ellestad 5:4, Restaurera vattendrag	TW	CB	Sjöbo		750	Detaljprojektering	2026-03: Ett läge som framkommit från utredningen "Återvätning Stiftelsen Skånska Landskap". Möjligheten att bryta upp en kulvert längs en sträcka på ca 700 m undersöks. 2026-08: Anmälan om vattenverksamhet är inskickad. Inventering av hedblomster (fridlyst) är genomförd av åtgärdsområdet. Åtgärden planeras genomföras under höst 2026.
S879	Brösarp 7:2 m.fl.	FH	TP	Sjöbo		2000	Detaljprojektering	Biotopvård i Vollsjöån 2026-04: Möjligheterna att genomföra biotopvård i och i anslutning till Vollsjöån undersöks. 2026-06: Förprojektering och dialog med MÅ och Lst genomförd. Planerad entreprenad 2027.

Återvätning

S883	Vallarum 3:10	EB		Sjöbo			Förprojektering	2026-08: Möjliga lägen för återvätning framkom ur Vollsjö dialogen. En förundersökning av möjliga lägen för återvätning av torv har inletts.

Utredning och Dialog

Ö807	Kontrollprogram Ö807 Rollsberga kvarn	FH	CB	Höör			Pågående	Vattennivån och avbördning mäts vid det anlagda omlöpet. 2026-01: Mätningen är pausad för tillfället eftersom MÅ har ändrat utloppet från det utlopp som anlades av VR. Detta påverkar avbördningen och resultatet från mätningen. Garantiåtgärder mot erosion genomfördes under hösten 2025.
S861	Uppföljning av fiskåtgärd Lilla Torpsbäcken	TW	TP	Sjöbo			Pågående	Uppföljning av de fiskevårdsåtgärder som genomförts i Lilla Torpsbäcken med hjälp av inventeringar och installation av en fiskräknare. 2025-02: Fiskräknaren planeras att installeras under ferbuari. 2025-03: Fiskräknaren är installerad. 2025-09: Fiskräknaren monterades ner i juni och förvaras på Vombverket. Planen är att installera den i omlöpet i december för att fortsätta uppföljningen av omlöpet. 2025-12: installation av Fiskräknaren planeras i början av december. En dialog med forskare på LU har förts om möjligheten av samarbete där LU skulle hjälpa till med genomförandet av uppföljningen. 2026-01: fiskräknaren är installerad, men inte ännu driftsatt pga strömbrist och kyla. 2026-02: Fiskräknaren kunde driftsättas från andra hälften av januari. 2026-08: Fiskräknaren inkl ställning, solceller och batterier monterades ned under tidig sommar och lämnades in till förvaring hos Sydvattnen på Vombverket.
U400	Uppföljning Veberöd plankdämme	BW	CB	Lund			Pågående	Uppföljning av plankdämmets effekt på höga flöden. 2026-03-24 : ska följas upp och stängas ned 2026-04: Eftersom det hittills varit få tillfällen med tillräckligt höga flöden för att se effekterna av påfyllnad på översvämningsytorna föreslår vi att mätningen får fortgå ytterligare en vintersäsong - det vill säga fram till våren 2027
S405	Återvätning stiftelsen Skånska Landskap	TW	CB	Sjöbo			Pågående	Dialog för med MÅ (stiftelsen skånska landskap) och möjliga åtgärder undersöks, fokus för åtgärder kommer vara återvätning och fördröjning. Projektet är finansierat med LONA medel. 2025-04: Ett första dialogmöte har genomförts med stiftelsen. Ett ambitionsmål, metod för genomförande håller på att tas fram. 2025-09: Arbetet med utredningen är påbörjat och kommer fortgå till våren 2026 enligt preliminär plan. Arbetet innefattar en utredning av möjligheterna till total hydrologisk restaurering på fastigheten Ellestad 5:4. Arbetet kommer resultera i en åtgärdsplan för möjliga åtgärder på fastigheten. 2025-11: Under hösten har fältarbetet för projektet genomförts och är avslutat. En fältdag med Stiftelsen och vattenrådet har också genomförts. 2025-12: En dialog med MÅ och VR har hållts där datan från besiktning presenterades och det fortsatta arbetet diskuterades. 2026-01: Utökad mängd LONA för detta projekt har beviljats av Lst. 2026-02: Arbetet med sammanställning av insamlad data fortsätter. 2026-03: Arbetet att sammanställa data fortsätter, ett möte med Skogsstyrelsen har skett för att höra vilka av åtgärdsförslagen de kan genomföra. 2026-06: Arbetet med att sammaställa projeket fortsätter och planeras vara klart till efter sommaren. Dialog för genomförande har fortsatt med skogsstyrelsen. 2026-08: Slutversionen av utredningen har levererats till VR och MÅ i form av en åtgärdsplan
	Dialog Vollsjö	TA	TP	Sjöbo			Pågående	2025-09: En dialog ska genomföras med ett antal markägare runt Vollsjö. Arbetet kommer startas under hösten 2025. 2025-11: Arbetet fortskrider och ett datum för dialogmötet är satt. 2026-01: Ett första möte hölls i dec 2025. 2026-02: inbjudan till ett andra möte är utskickat, till detta möte är även målgruppen utökad något för att också inkludera ett större område. 2026-03: Alla dialoger är nu genomförda och sammanställning av resultatet pågår.
	Fokus Vombsjön uppföljning Hjälmäröd	JK	TP	Eslöv			Pågående	2026-03: Fokus Vombsjön vill följa upp utvecklingen och effekten av våtmarken på Hjälmäröd 9:1. Ett uppföljningsprogram håller på att tas fram. 2026-04: Det föreslagna uppföljningsprogrammet antogs av Fokus Vombsjöns styrgrupp och kommer påbörjas under året. 2026-08: En beställning är av uppföljningsprogrammet är signerad och ska genomföras av EG utanför uppdraget Kävlingeåns vattenvårdsprogram med start tidig höst 2026.
	Helhetsgrepp Sövdeborg	TW	TP	Sjöbo			Pågående	2026-06: TP och Thomas hade ett första möte med MÅ under tidig vår 2026 där markägaren visade intresse för untredning och åtgärder. TP och TW hade ett möte i fält med MÅ i mitten av maj där projekt idén förklarades tydlig. MÅ fortfarande positiv och gav klartecken för projekt. Ett möte hölls i mitten av Juni med Lst där godkännande gavs för att utreda inom skyddade områden påfastigheten. 2026-08: En ansökan om LONA medel är inskickad.

	Besiktningar åtgärder Bråån - Torka	SW						2026-09: VR blev under sommaren upplysta om att delar av Bråån var torrlagd på grund av den rådande grundvattensituationen i södra Svergie som beror på låga mängder nederbörd de senaste två åren. I samband med denna diskussion ställdes frågan om hur VR åtgärder påverkar och påverkas av situationen. Därför bestämdes det att en besiktning av ett antal anlagda åtgärder längs Bråån skulle genomföras för att skapa en bättre uppfattning. Besiktningarna är genomförda och sammanställda och resultatet är levererat till VR.
--	-------------------------------------	----	--	--	--	--	--	---

Reparation underhåll
Pågående 2025-2026

E808	Lilla Skeglinge 1:1, Eslöv	FH	TP	Eslöv				2023-10: EG har gjort skiss på planteringsplan som är skickad till markägare för synpunkter. Enligt avtal ska VR bekosta plantering givet att miljönytta finns, dialog kring omfattning. 2024-09: inväntar svar från MÅ på förslag till planteringsplan. 2025-03: MÅ har godkänt planteringsplan. Nästa steg är att handla upp entreprenör. 2025-09: entreprenör handlades upp under sommaren o arbetet är planerat att genomföras i höst. 2025-12: Planteringen är genomförd. Insådden kommer göras av MÅ och instruktioner är överlämnade. 2026-05: EG rekommenderar att hoppa sådden efter att MÅ flyttat plantorna. MÅ tar över allt ansvar för planteringen.
	Plan för reparation och underhåll 2026	SW	TP					En inventering av behovet av reparation och underhåll av åtgärder, besiktning av åtgärder samt en plan för de rep och underhåll entreprenader som ska genomföras under 2026 tas fram.
E244	Gårdsstånga 17:5	SW	TP	Eslöv				2025-09: Behovet av reparation undersöktes och bedömde finnas. Arbetet bedömdes dock som komplicerat på grund av att de massor som ska hanteras potentiellt kan vara förorenade, därför skjuts reparationen upp till kommande år då möjligheterna för genomförande bedöms som bättre. 2026-02: Reparationens genomförande utreds. 2026-04: Ett beslut har tagits att KVR inte genomför någon reparation och underhåll för denna åtgärd då åtgärdens skick beror på bristande underhåll av MÅ.
L228	Flyinge 6:9	SW	TP	Lund				2026. Fältbesökt. Fråga om skötselansvar tas upp i BG 2026-04: Frågan har diskuterats i BG och en bedömning har gjorts att KVR inte genomför någon reparation eller underhåll.
S529, S578, S535	Övedkloster 2:23	SW	TP	Sjöbo				2026. Åtgärder vid flera våtmarker/dammar. 2026-04: behovet av reparation och underhåll har utretts och resulterat i ett förslag där S529 kommer rensas och reparation av utlopp i S535 ska ske.
H9B	Böstofta 19:3	SW	TP	Höör				2026. Svag igenväxning. Kan samordnas med entreprenad vid ny våtmark på samma fastighet om denna blir av.
E129, 129 B	Slogstorp 17:8	SW	TP	Eslöv				2026. Rensning inför överlämning - avtal överlämning. Hög prio -överlämning av anläggning enligt överlämningsavtal efter åtgärder.
U186	Igelösa 7:1	SW	CB	Lund				2025. MÅ undrade om möjligheten att få våtmarken vid Örtofta rensad och eventuellt utvidgad. 2025-09: eftersom omfattningen av reparationen bedöms som relativt stor har reparationen av denna åtgärd skjutits till 2026. Kan ev ses som nyanläggning. 2026-02: Möte i fält med MÅ planeras under februari. 2026-03: Vid fältbesök föreslog MÅ att utöka våtmarken istället för att reparera befintlig. Möjligheterna till detta undersöks.2026-04: Möjligheterna att utöka befintlig våtmark anses som goda och åtgärden lyfts därför ur reparation och underhåll och blir ett eget projekt.
L549	Önnerup 33:2	MJ	TP	Lomma				2025-09: Reparationen av anläggningen genomförs i samordning med reparationerna av de andra åtgärderna. En entreprenör handlades upp under sommaren och reparationen ska genomföras under hösten. 2025-10: Ett dialogmöte ska hållas med markägare, NSVA m.fl. syfte - synka info om hydrologi. 2026-02: Reparationen är genomförd.
-	Ytterligare i behov av rep/underhåll (anmälda av markägare)	FH, TW	TP	-				Tas in successivt. Diskussion om växande behov av reparation och underhåll, samt ramavtalad entreprenad behövs.

Utveckling och Övrigt

Vattenstrategin	TA	CB					Tette Alström och Christian Alsterberg (Sydvatten) arbetar med en utredning om hur vattenrådets arbete kommer formas i framtiden. Arbetet har fortsatt i form av ett flertal dialoger med beredningsgrupp och styrelse. 2026-08: Vattenstrategin presenterades och antogs på årsstämma 2026.
Överlämningsavtal anläggning	TA, FH	TP					Framtagning av plan för överlämning av anläggningar vid uppsägning av avtal. 2026: Slogstorp 17:8 blir den första överlämningen.
Policy Rep och underhåll	FH						En utredning om policyn för reparation och underhåll av åtgärder inom KVVP
